

原住民族委員會

111 年度「原住民族公共建設第 6 次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：111 年 7 月 26 日下午 2 時

貳、地點：線上視訊會議

谷縱·喀勒芳安

參、主持人：Qucung Qalavangan 副主任委員

紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如簽到表及線上視訊會議截圖

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、歷次會議列管情形報告

今年度推動會報共列管 43 件案件，已解除列管 16 件，本次會議再解除列管 10 件（列管案件執行率 60.47%），餘 17 件繼續追縱，請各計畫主辦單位積極辦理，以促進計畫推動順遂。

捌、重要事項宣達

一、鋼料部分，產能利用率僅七成，惟近來價格受國際廢鋼價格波動影響持續上漲，請各計畫主辦單位、各直轄市與縣(市)政府掌握並參考下列兩點原則辦理，倘後續工程流標，而無積極作為，仍以缺工、缺料為由者，工程會將檢討責任：

(一)個案計畫內容及編列預算應扣合需求，預算編列須合理，設計須扣合計畫定位及預算範圍，施工中可採三層級物調機制（個別項目指數、中分類項目指數及總指數）辦理。

(二)可採由機關提供材料方式辦理。

二、各計畫主辦單位、各直轄市與縣(市)政府辦理公共工程之列管及執行，應掌握下列事宜：

(一)應加強與各權責機關間之橫向聯繫：以「火車頭園區建置計畫」為例，因臺鐵局與客委會間缺乏有效銜接，致產生資訊流通之介面問題而未能正確規劃。另以「桃園航空城第三跑道建設計畫排

水規劃」為例，因桃園市政府及桃園機場公司間各自為政，埔心溪已新闢疏洪道，確在機場跑道下方保留原河道做箱涵，導致後續維護管理困難，以及安全性及合理性問題。

(二)不因委外規劃設計或聘請專家學者辦理審查認可，而得減少或免除應負之責任：教育部「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」為例，機關以委外審查為由，不判斷合約書圖之合理性；而火車頭園區則有規劃顧問高估樓地板面積3倍，致財務評估結果不合理之情形。

玖、整體預算報告

- 一、前瞻基礎建設計畫：111年6月份整體預算執行率115.9%，達成率19.9%，其中「推動原住民族多元產業發展2.0計畫」執行率88.3%，未達90%，請經濟發展處持續督導發包及請款。
- 二、一般公共建設計畫：111年6月份整體預算執行率115.8%，達成率29.8%，尚無落後計畫。
- 三、本會111年6月份預估達成率15.68，實際達成率24.9%，雖低於各部會平均值39.43%，惟短期縮短與各部會平均之精進措施已有成效，仍請各計畫主辦單位以執行率150%為目標，持續推動加速發包措施、加強稽催請款，以及填列應付未付數。
- 四、為達全年度符合部會平均值之目標，112年度公共建設計畫之主辦單位請依長期措施，確實完成前置作業，並合理分配預算。

拾、全國性業務報告

一、前瞻基礎建設計畫—原民部落營造

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 本計畫第三期(110、111年)經費3億3,200元，其中本年度經費1億6,600元，依所報預算核定率為100%，惟未預估111年7月份預算執行率，請社會福利處確實辦理，並依精進措施執行。
2. 可請款案件，請社會福利處稽催請領，包含花蓮縣、臺中市、新竹縣、屏東縣、臺東縣等27件，請儘速報會請領。

(二)原住民族住宅營造

1. 本計畫第三期(110、111年)經費1億元，其中本年度經費7,000萬元，預算核定率為174%，預估111年7月份預算執

行率 130%，達成率 55.86%，請公共建設處依精進措施辦理。

2. 發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新竹市「那魯灣部落家屋重建計畫先期規劃設計」請於 111 年 7 月底前完成公告上網。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 本計畫第三期(110、111 年)經費 3 億元，其中本年度經費 1 億 1,000 萬元，預算核定率為 211%，預估 111 年 7 月份預算執行率 194.53%，達成率 35.37%，請公共建設處依精進措施辦理。
2. 發包落後案件，新竹縣「五峰鄉桃山村 8 鄰及 10 鄰周邊環境步道及排水改善工程」業於 111 年 7 月 12 日決標，臺中市「梨山里松茂部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」、「平等里環山部落部落服務據點周邊及部落內公共設施改善工程」業於 111 年 7 月 5 日決標，同意解除列管，其餘請公共建設處督導趕辦，包含屏東縣「瑪家鄉排灣部落文化聚會所新建工程」請於 111 年 9 月底前完成發包；花蓮縣「新城鄉公所康樂部落之心計畫暨巴拉米旦聚會所增設公廁及儲藏室工程」因再流標需第二次檢討預算，同意延至 111 年 8 月底前完成發包。
3. 可請款案件，請公共建設處稽催請領，包含屏東縣、花蓮縣等 2 件，務請於 111 年 7 月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫第三期(110、111 年)經費 1 億元，其中本年度經費 7,000 萬元，依所報預算核定率為 100%，惟未預估 111 年 7 月份預算執行率，請教育文化處確實辦理，並依精進措施執行。
2. 發包落後案件，臺南市「西拉雅族北頭洋文化館興建計畫」業於 111 年 7 月 5 日決標，同意解除列管；其餘案件請教育文化處督導趕辦，包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」請於 111 年 7 月底前完成發包。

3. 可請款案件，請教育文化處稽催請領，包含花蓮縣「光復鄉太巴塢部落多元服務中心」規劃設計，請於111年8月10日前請領第二期款。

二、前瞻基礎建設計畫－推動原住民族多元產業發展2.0計畫

- (一)本計畫第三期(110、111年)經費8億元，其中本年度經費5億元，核算預算核定率為88.4%，惟未預估111年7月份預算執行率，請經濟發展處確實辦理，並持續加速審查、核定，依精進措施執行。
- (二)發包落後案件，臺南市「札哈木·原住民創意中心」業於111年7月7日決標，同意解除列管。

三、前瞻基礎建設計畫－加速推動地方創生計畫

- (一)本計畫第三期(110、111年)經費6,000萬元，其中本年度經費3,000萬元，依所報預算核定率為99.83%，惟未預估111年7月份預算執行率，請經濟發展處及公共建設處確實辦理，並依精進措施執行。
- (二)發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，增列南投縣「信義鄉羅娜村部落環境改善工程」、嘉義縣「阿里山鄉樂野村部落道路入口處改善工程」請於111年8月底前完成發包；嘉義縣「阿里山鄉里佳村尼亞烏茲那溪步道新建工程」請於111年9月底前完成發包。

四、原住民族經濟產業發展4年計畫

本計畫年度經費8,088萬元，為110年度保留款，預估111年7月份預算執行率100%，達成率100%。

五、原住民族部落特色道路改善計畫

- (一)本計畫年度經費6億502萬元，預算核定率為121%，預估111年7月份預算執行率109.61%，達成率41.14%，請公共建設處依精進措施辦理。
- (二)發包落後案件，嘉義縣「來吉五鄰橋復建工程」業於111年6月30日決標，南投縣「雙龍村雙龍及洽波石部落聯絡道路改善工程」業於111年6月28日決標，花蓮縣「長良里吉哈蓋部落道路改善工程」業於111年7月12日決標、「港口村港口部落道路改善工程」業於111年7月13日決標，同意解除列管；其餘案件請

公共建設處督導趕辦，包含屏東縣「好茶村聯絡道路復建工程暨延伸至好茶舊社路線」請於111年8月底前完成發包；臺東縣「重安一號橋改善工程」因設計書圖審查又延宕至7月份完成，務請於111年8月底前完成發包；苗栗縣「錦水村北岸道路改善工程」請於111年8月底前完成發包；新竹縣「桃山村雲山替代道路北段改善工程(第二期)」請於111年9月底前完成發包；屏東縣「達來車行吊橋興建工程」請於111年7月底前完成發包；屏東縣「大社村往德文村聯絡道路改善工程」因111年6月30日會勘評估結果，無辦理之必要性，請於111年8月底前來函註銷；屏東縣「武潭村武潭平和聯絡道路改善工程」請於111年8月底前完成工程發包；屏東縣「石門往四林道路改善工程(第三期)」、「旭海部落道路改善工程」、「東源村東源往牡丹外環道路改善工程」請於111年7月底前完成發包；臺東縣「多良村給陵部落往舊部落道路改善工程」請於111年8月底前完成發包。

- (三)進度落後案件，嘉義縣「有富給聯絡道路改善工程(第三期)」因遭遇其他災修工程影響無法施工，同意暫時解除列管，並視復工後趕工情形再評估列管，其餘請公共建設處督導趕趕，包含臺東縣「大王村卡茲達斯部落聯外道路改善工程」因變更設計停工，同意延至111年8月底前趕上預定進度。
- (四)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等10件，請於111年8月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (五)結案資料缺漏案件，請公共建設處督導改善，僅臺東縣等2件，請儘速報會補正。

六、宜居部落建設計畫

- (一)本計畫年度經費1億9,834萬元，預算核定率為115.39%，預估111年7月份預算執行率111.88%，達成率13.54%，請公共建設處依精進措施辦理。
- (二)居住環境品質提升計畫發包落後案件，請公共建設處督導趕辦，包含新北市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣，臺東縣、花蓮縣等31件，已逾111年7月20日發包期限，請儘速完成發包。

- (三)未請款案件，請公共建設處稽催請領，包含高雄市、屏東縣、臺東縣及花蓮縣等5件，請於111年8月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理。
- (四)本計畫預計於8月將召開安全防減災補助計畫第4次審查評比會議，如有補助需求，請各直轄市及縣(市)政府依規定提報計畫至會。
- (五)本計畫線上課程業於111年6月20日上線，請各直轄市及縣(市)政府踴躍報名參加。

七、原住民族部落永續發展造景計畫

- (一)本計畫年度經費1,860萬元，為110年度保留款，請公共建設處依精進措施辦理。
- (二)未請款案件，請公共建設處稽催請領，僅花蓮縣4件，請於111年8月底前請領，如有逾期，本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計畫作業及管考要點」辦理，其中花蓮縣「馬太林部落泰林原住民文化園區跳舞場修繕工程」、「松浦福音部落護坡工程」已累計計點4次，將依前開要點第八點第一項第五款規定扣減工程管理費。

八、工程施工查核報告

查核缺失改善未完成案件如下，請各直轄市及縣(市)政府督促執行機關儘速改善或展延期限：

- (一)苗栗縣政府原住民族事務中心：泰安鄉大安部落文健站服務據點周邊及部落內公共設施改善工程(第二期)。
- (二)宜蘭縣大同鄉公所：110年度宜蘭縣大同鄉創生計畫崙埤部落生態旅遊基地泰雅地景公園環境營造。

拾壹、花東業務報告

一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

- (一)第二期計畫共核定14件，已完成13件，惟「長光部落文化聚會所」仍未取得使用執照，另依進度施工中1件，請公共建設處督導趕辦。
- (二)第三期計畫共核定15件，已完成2件，依進度施工中4件，另規劃設計中9件，請公共建設處確認並督導趕辦。

二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定6件，已完成6件，惟「朗島村」、「紅頭村」、「漁人村」、「野銀村」仍未報結，請公共建設處督導趕辦。

三、蘭嶼社區總體營造計畫

本計畫共核定6件，已完成1件，就地結算中4件、評估續辦中1件，請公共建設處依聯合稽查小組決議督導趕辦。

四、花蓮縣部落聚會所興建計畫

(一)第二期計畫共核定16件，已完成9件，惟「馬遠部落聚會所」、「南華部落聚會所」仍未取得使用執照，另依進度施工中7件，請公共建設處督導趕辦。

(二)第三期計畫共核定19件，已完成1件，惟「馬太鞍部落聚會所」仍未取得使用執照，依進度施工中3件，另規劃設計中15件，請公共建設處督導趕辦。

五、花蓮個案工程計畫

(一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，未說明工程進度，請教育文化處確實辦理，並依前次決議提供工程管制表。

(二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，未說明工程進度，請教育文化處確實辦理，並依前次決議提供工程管制表。

(三)花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫之陽光電城文創產業聚落案，工程進度79.13%，預定111年8月完工，依進度施工中，請經濟發展處督導趕辦。

(四)太巴塢祭祀廣場部落驛站建構計畫，已於111年2月21日完工，惟需配合第二期工程進行，預定於111年12月底前啟用，請公共建設處確依前次決議補充說明第二期工程進度。

拾貳、會內業務報告

一、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造7年(106年-112年)中長程計畫

(一)本計畫年度經費3億1,045萬元，核算預算核定率為112.5%，預估111年7月份預算執行率153.76%，達成率24.95%，請原住民族文化發展中心儘速完成歌舞館增建之預算書圖核定，並依精進措施辦理。

(二)為瞭解綠珠雕琢第二期中長程個案計畫辦理情形，請於下次推動會報簡報說明。

二、國立原住民族博物館園區興建計畫

本計畫業經行政院於111年2月8日核復審議意見，嗣於111年4月28日簽陳計畫修正，惟須俟行政院同意後方得提報修正計畫，請教育文化處掌握報修期程，並預先研擬未於年底前奉核之因應對策。

三、財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建計畫

本計畫依規劃進度執行中，請教育文化處督導趕辦，並確依前次決議補充說明工程進度及提供工程管制表。

四、原住民族廣播電臺設置第一期(105~108年)計畫

本計畫截至111年6月底止，已建置27座轉播站，餘10座轉播站，請教育文化處督導趕辦，包含「南投」、「茶山」、「森永」請於111年12月31日前完成建置；「泰安」、「尖石」、「和平」、「牡丹」、「烏來」、「豐濱」請於112年12月31日前完成建置；「梅山」因涉及重新規劃替代方案，請於113年12月31日前完成建置。

五、原住民族紀錄片

本計畫總經費4,645萬元，契約金額4,290萬元，已撥付第一期款(20%)，整體預算達成率18.47%，需俟影片腳本審查完成後撥付第二期款，惟未說明預定工作里程碑期程與撥款條件，請教育文化處確實辦理，俾利計畫進度控管。

六、行政院活化閒置公共設施管理

「東埔原住民活動中心」案：整修工程因111年7月26日第一次開標流標，請經濟發展處督導趕辦發包。

拾參、散會：下午4時15分





111 年度原住民族公共建設第 6 次推動會報 簽到表

壹、開會時間：111 年 7 月 26 日下午 2 時

貳、會議地點：線上視訊會議

參、主持人：


肆、出(列)席單位： 紀錄：

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
王技監瑞盈				
綜合規劃處		(請假)		
教育文化處			科員	
社會福利處	(視訊)	柯麗貞		
經濟發展處	專委	高文斌	技正	
公共建設處	處長	劉和光	科員	
		科長	科長	
		周錫蔚	技正	
			科長	
			技士	
	技士	張哲睿	技士	
創聚環境管理顧問股份有限公司				
方興環境工程技師事務所				


111 年度原住民族公共建設第 6 次推動會報 簽到表

單位	職稱	姓名	職稱	姓名
新北市政府		石志強		
桃園市政府	(視訊)	游博順		
新竹縣政府	(視訊)	葉泰源		
新竹市政府	(視訊)	林瑜馨		
苗栗縣政府	(視訊)	邱太昌		
臺中市政府	(視訊)	林銘樞		
南投縣政府	(視訊)	周智	(視訊)	詹孝忠
嘉義縣政府	(視訊)	詹大帥		
臺南市政府	(視訊)	陳子晴		
高雄市政府	(視訊)	黃嵩傑		
屏東縣政府	(視訊)	Patjereljaw Sened		
宜蘭縣政府	(視訊)	Ivan Jiang		
花蓮縣政府	(視訊)	金葉靈		
臺東縣政府	(視訊)	陳嬿		
原住民族文化 發展中心	(視訊)	原民會文發中心		


(視訊)
全靜如

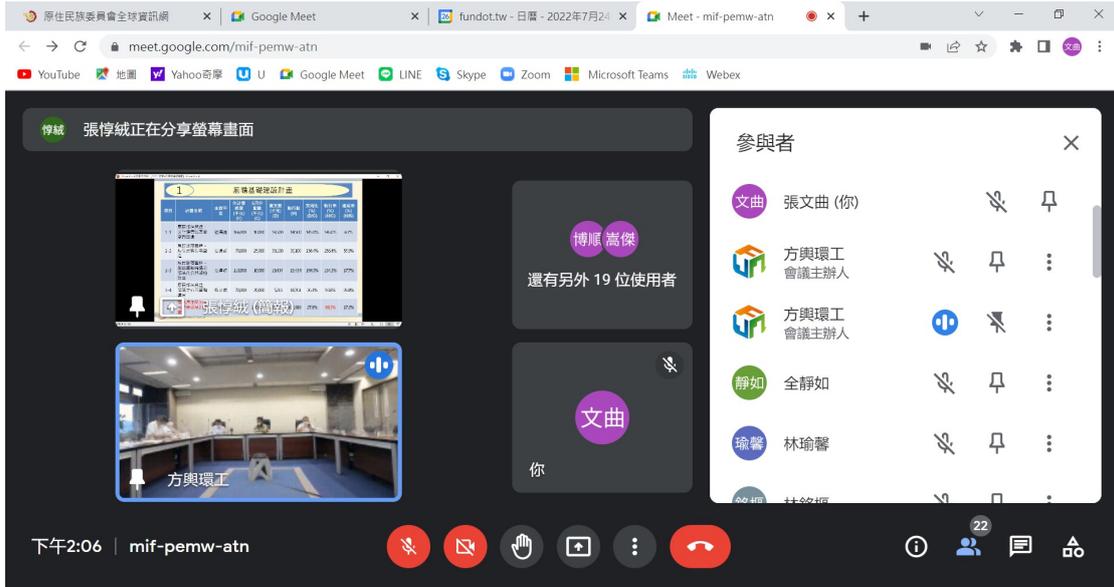

臺中市政府
新竹市政府

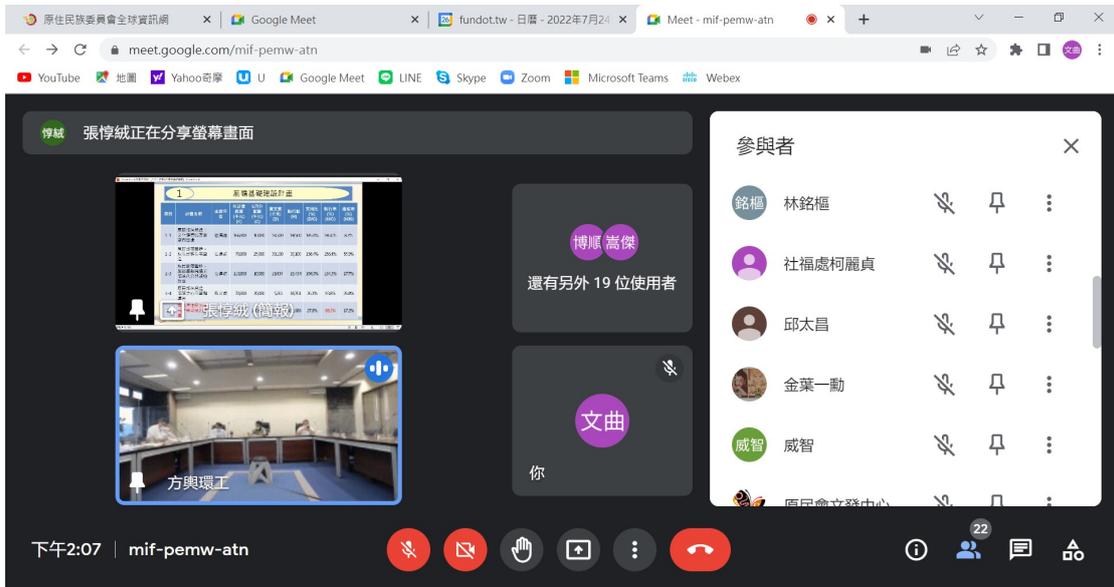


臺中市政府
本會社福處
苗栗縣政府
花蓮縣政府
臺中市政府

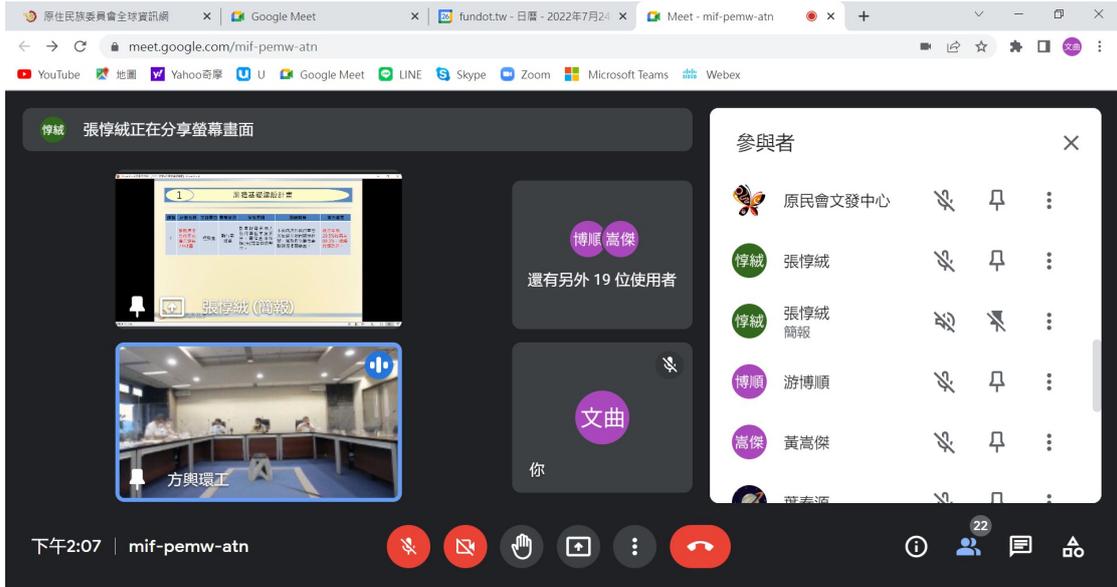

文發中心

桃園市政府

高雄市政府

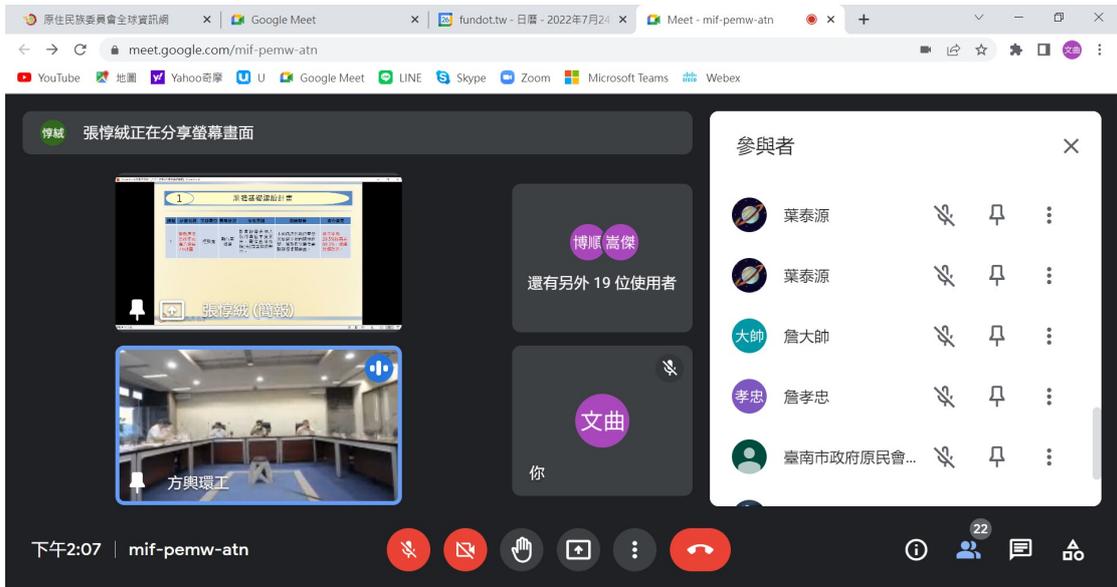

新竹縣政府

嘉義縣政府

南投縣政府

臺南市政府

原住民委員會全球資訊網 | Google Meet | fundot.tw - 日曆 - 2022年7月24 | Meet - mif-pemw-atn

meet.google.com/mif-pemw-atn

YouTube | 地圖 | Yahoo奇摩 | U | Google Meet | LINE | Skype | Zoom | Microsoft Teams | Webex

張惇絨正在分享螢幕畫面

博恩 高傑
還有另外 19 位使用者

文曲
你

參與者

- 大帥 詹大帥
- 孝忠 詹孝忠
- 臺南市政府原民會...
- Ivan Jiang
- Patjerejlaw Sened

下午2:07 | mif-pemw-atn

宜蘭縣政府
屏東縣政府

原住民委員會全球資訊網 | Google Meet | fundot.tw - 日曆 - 2022年7月24 | Meet - mif-pemw-atn

meet.google.com/mif-pemw-atn

YouTube | 地圖 | Yahoo奇摩 | U | Google Meet | LINE | Skype | Zoom | Microsoft Teams | Webex

張惇絨正在分享螢幕畫面

博恩 高傑
還有另外 19 位使用者

文曲
你

參與者

- 方興環工 會議主辦人
- 方興環工 會議主辦人
- 台東縣政府陳兆慶
- 靜如 全靜如
- 瑜馨 林瑜馨

下午2:11 | mif-pemw-atn

臺東縣政府
