


原住民族地區公共工程第7次推動會報

工程施工查核情形檢討



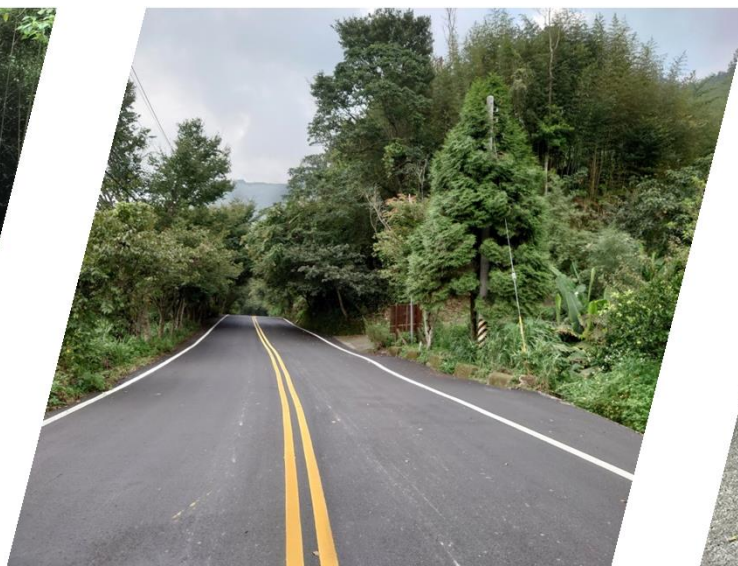

目錄




- ▶ 一、110年度查核進度
- ▶ 二、110年度查核統計資料
- ▶ 三、110年度查核缺失改善未結案件
- ▶ 四、110年度查核品質缺失違約金未結案件
- ▶ 五、110年度施工查核作業執行績效考核評分



一、110年度查核進度

年度查核總件數 50件，規劃至9月底查核 37件，截至9月15日實際查核 32件。

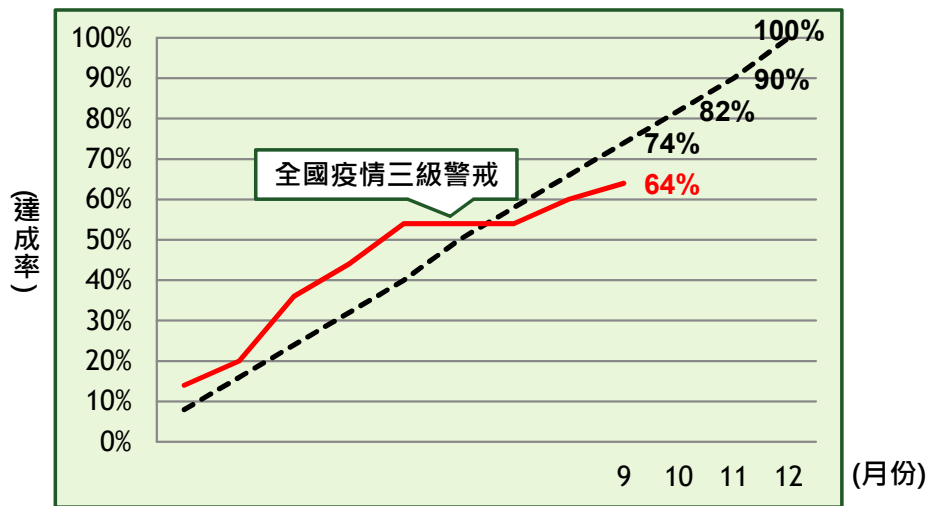

◎年度查核件數辦理情形一覽表

單位：件


月	預訂	實際	預訂(累計)	實際(累計)
1	4	7	4	7
2	4	3	8	10
3	4	8	12	18
4	4	4	16	22
5	4	5	20	27
6	5	0	25	27
7	4	0	29	27
8	4	3	33	30
9	4	2	37	32
10	4	-	-	-
11	4	-	-	-
12	5	-	-	-

- +4
- +5
- +5
- +4




二、110年度查核統計資料

查核等地比例

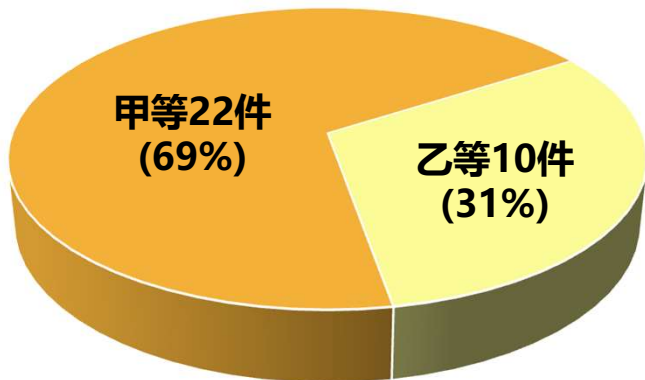


缺改完成達成率

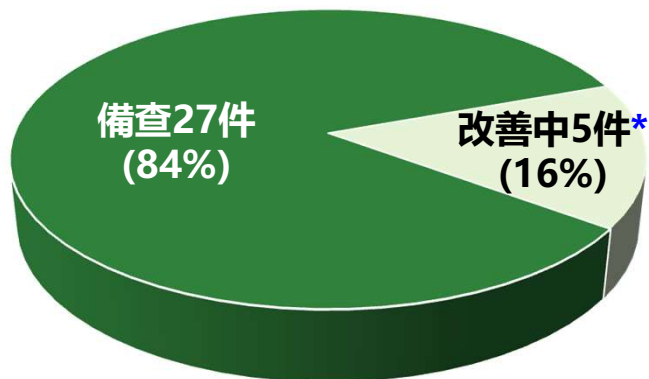

*: 改善中(5件)詳如后

違約金繳回情形

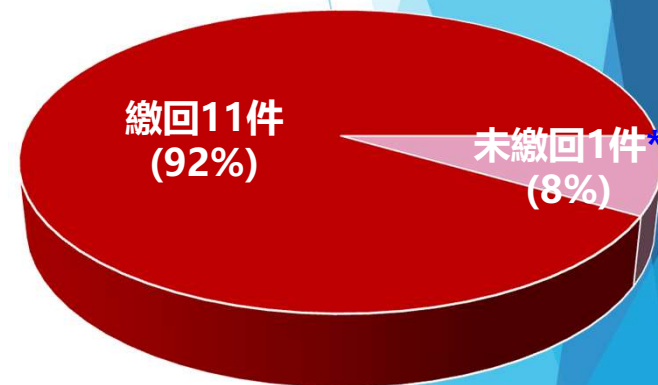

*: 未繳回(1件)詳如后



三、110年度查核缺失改善未結案件

序號	主辦機關	工程名稱	查核日期	提送期限	未結案原因
1	(苗栗縣政府) 苗栗縣政府原住民族事務中心	泰安鄉中興村出火道路改善工程	8/20	9/24	因主辦機關函復(第一次)之改善情形不良，業以110.09.13退件(原民建字第1100053053號函)要求補正並於09.24前報會，迄今尚未回復。
2	(苗栗縣政府) 苗栗縣政府原住民族事務中心	泰安鄉中興村中興3鄰道路改善工程	8/20	9/24	因主辦機關函復(第一次)之改善情形不良，業以110.09.13退件(原民建字第1100053070號函)要求補正並於09.24前報會，迄今尚未回復。
3	(屏東縣政府) 屏東縣政府原民處	屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期工程	8/27	9/17	本案業於110.09.06將查核紀錄函(原民建字第1100050888號)送工程主管或主辦機關，迄今尚未回復。
4	(屏東縣政府) 屏東縣春日鄉公所	歸崇村歸崇土文部落聯絡道路改善工程	9/10	10/1	本案業於110.09.15將查核紀錄函(原民建字第1100053373號)送工程主管或主辦機關，迄今尚未回復。

註：餘1案(三光里武道能敢部落銜接三光跨河大橋道路改善工程)於9月14日查核竣事，紀錄彙整作業中。



四、110年度查核品質缺失違約金未結案件

序號	主辦機關	工程名稱	查核日期	缺改狀態	違約金期限	未結案原因
1	(屏東縣政府) 屏東縣政府原民處	屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期工程	8/27	修正中	12/25	本案懲罰性違約金辦理情形尚未函復本會。

註：依據本會110年度查核實施計畫規定，品質缺失懲罰性違約金逾期回復者(查核次日起4個月)，本會並扣該補助之工程管理費百分之十。

The End
