

宜居部落建設計畫 (111年—114年)

114年7月執行進度

(本案作業計畫業於114年05月01日調整公告)

主辦機關：原住民族委員會(公共建設處) 114/08/06 16:24

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	宜居部落建設計畫 (111年—114年)	個案計畫統一編號	A5-6211-1226
計畫期程	111/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	1,400,000
計畫類別(先期類別)	公共建設(都市及區域發展)	總計畫經費(千元)(J)	1,420,192
主管機關	原住民族委員會	年計畫經費(千元)(K)	516,999
主辦機關(單位)	原住民族委員會(公共建設處)	院核管制編號	1110450
共同主辦機關(中央)	原住民族委員會(公共建設處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣	空間資料	預覽
計畫核定情形	宜居部落建設計畫 (111至114年)：行政院 110年09月27日院臺原字第1100029028號		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫、原住民族政策		
計畫年度目標	一、完成部落建設整體評估比例達5%。 二、完成部落風險或意見溝通達40場次。 三、提升部落防(減)災受益面積達240公頃。 四、保全受益部落人口數達4,800人。 五、改善文化景觀環境受益面積達948公頃。 六、聚會或特殊慶典參與人次達13,275人。		
計畫年度摘要	一、部落永續建設藍圖規劃。 二、強化部落安全防(減)災機能。 三、提升部落環境居住品質。		

註：本計畫與去年度1110450-宜居部落建設計畫 (111年—114年) 為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	林冠宇	02-8995-3274		al2226n@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-8995-3228		wchuang0328@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫
技正	陳昱宏	02-89953271	02-89953684	as810197@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫
科長	黃文池	02-89953228		wchuang0328@cip.gov.tw	宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務
科長	黃文池	02-89953225		wchuang0328@cip.gov.tw	辦理113年度保留案件

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度超前 2.31 個百分點，年累計支用比 93.42%，年分配經費執行率 119.27%。

2.1.2 總累計執行進度超前 0.58 個百分點，總累計支用比 98.67%，總分配經費執行率 103.88%。

年度：114 月份：7

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	18.80			21.11		2.31		
總累計	79.70			80.28		0.58		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	228,000	213,008	93.42	54,889	4,031	0	271,928	119.27
總累計	1,131,193	1,116,201	98.67	54,889	4,031	0	1,175,121	103.88
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				52.60			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				82.74			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				83.94			
支用比>100%或分配經費執行率≥120%原因說明								
1 辦理藍圖規劃發包： 執行案件為113年跨年度案件，趕辦稽催結果致地方執行超前。								

2 工程施工：

因原定分配數過於悲觀，且配合主委指示需於6月底前保留達成率達90%，地方執行超前。

預定工作摘要	整體執行情形說明
<p>1110450-001：補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫 辦理藍圖規劃發包</p> <p>1110450-002：補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫 計畫發包</p> <p>1110450-003：補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫 計畫發包</p> <p>1110450-004：宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務 提交期中報告書</p> <p>1110450-005：辦理113年度保留案件 工程施工</p>	<p>藍圖規劃：已完成15件藍圖規劃發包。</p> <p>防(減)災工程：已完成21件計畫發包。</p> <p>環境品質工程：已完成57件計畫發包。</p> <p>行政事務：已於114年7月16日完成期中報告書審查。</p> <p>保留案件：保留案29件，已完成10件、執行中19件。</p>

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	10.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	72.00	280.00
3	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	71.00	820.00
4	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	898.00	16,400.00
5	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	563.00	2,367.00
6	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	6,863.00	33,144.00

7	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
8	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	86.15	100.00
截至前一年度止總累計實際進度				截至前一年度止總累計已執行數(千元)			
75.00%				903,193			
重要執行成果							
<p>藍圖規劃：預定完成盤查及藍圖規劃部落比例 5%，截至114年7月底止，完成盤查及藍圖規劃部落比例 10%。</p> <p>藍圖規劃：預定完成與部落族人進行溝通40場次，截至114年7月底止，完成與部落族人進行溝通 72 場次。</p> <p>防(減)災工程：預定提升部落防(減)災受益面積 240 公頃，截至114年7月底止，防(減)災工程改善受益面積 71 公頃。</p> <p>防(減)災工程：預定保全受益部落人口數 4,800 人，截至114年7月底止，防(減)災工程受益部落人口數 898 人。</p> <p>環境品質工程：預定因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積948公頃，截至114年7月底止，環境工程改善受益面積 563 公頃。</p> <p>環境品質工程：預定聚會或特殊慶典參與人次13,275 人次，截至114年7月底止，聚會或特殊慶典參與人數 6,863 人次。</p> <p>行政事務：預定辦理業務講習會、教育訓練 1 場次，截至114年7月底止，完成業務講習會、教育訓練 0 場次。</p> <p>113年度保留案件：預定113年保留預算達成率100%，截至114年7月底止，保留預算達成率 86.15%。</p>							

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無填寫資料
次要落後原因	無填寫資料
落後原因分析	無填寫資料
因應對策	無填寫資料
檢討與建議	無填寫資料
上次管考建議	無填寫資料
上次管考建議辦理情形	無填寫資料
主辦機關審查建議	無填寫資料
主管機關審查建議	無填寫資料

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：10.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)	實際進度(B)(%)	進度比較(B-A)百分點
年累計	15.00	16.00	1.00

經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	14,000	17,535	125.25	8,571	0	0	26,106	186.47

預定工作摘要	執行說明
辦理藍圖規劃發包	已完成15件藍圖規劃發包。

空間資料

面資料：本計畫無「面」空間資料
 點資料：1筆
 線資料：本計畫無「線」空間資料
[預覽](#)



3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	10.00	37.00

2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	72.00	280.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定2件藍圖規劃	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定2件藍圖規劃。
2	累計核定3件藍圖規劃	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定3件藍圖規劃。
3	累計核定4件藍圖規劃	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定3件藍圖規劃。
4	累計核定6件藍圖規劃	114/04/30完成	114/04/30符合	已核定9件藍圖規劃。
5	完成3件藍圖規劃公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	完成3件藍圖規劃公告招標
6	累計完成4件藍圖規劃公告招標	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成13件藍圖規劃發包。
7	累計完成6件藍圖規劃發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成15件藍圖規劃發包。
8	提交2件藍圖規劃期中報告	114/08/31完成		
9	累計提交3件藍圖規劃期中報告	114/09/30完成		
10	累計提交4件藍圖規劃期中報告	114/10/31完成		
11	提交2件藍圖規劃期末報告	114/11/30完成		
12	累計提交3件藍圖規劃期末報告	114/12/31完成		

3.1.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(%; M/L)	補助款執行率(%; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,584	1,550	1,550	97.85	97.85
新竹市	0	0	0	符合	符合


新竹縣	15,793	2,880	2,880	18.24	18.24
苗栗縣	2,988	2,268	2,268	75.90	75.90
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	8,739	4,824	4,824	55.20	55.20
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,812	2,376	2,376	84.50	84.50
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	616	264	264	42.86	42.86
屏東縣	3,339	0	0	0.00	0.00
宜蘭縣	1,104	810	810	73.37	73.37
花蓮縣	2,563	2,563	2,563	100.00	100.00
台東縣	2,592	0	0	0.00	0.00
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	42,130	17,535	17,535	41.62	41.62

3.2 工作項目二「補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	12.00			13.00		1.00		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	84,000	58,707	69.89	5,861	0	0	64,568	76.87
預定工作摘要					執行說明			
計畫發包					已完成21件計畫發包。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 預覽								

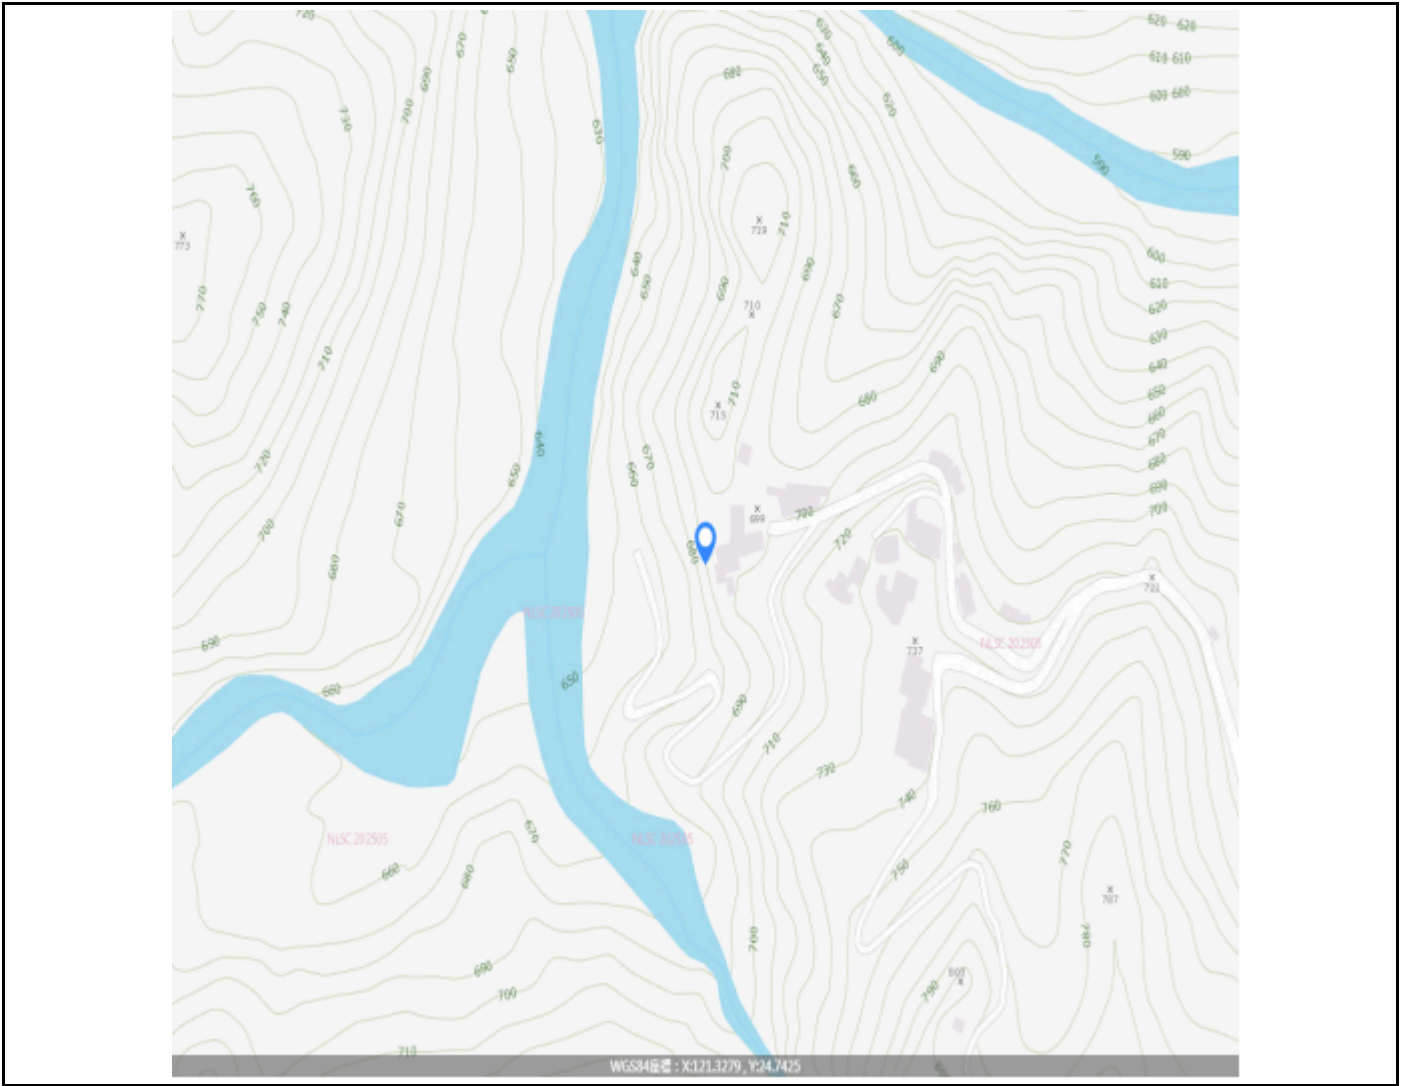

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	71.00	820.00
2	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	898.00	16,400.00
落後原因				防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：因行政院政策凍結50%補助款於6月方解凍，致計畫核定延誤，影響地方政府發包時程。			
解決對策				防(減)災工程年累計支用比未達 90%、年分配經費執行率未達 90%：已於114年7月29日推動會報督導趕辦已核定計畫，並於114年8月5日核定後續工程，預計114年9月份趕上。			

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。

2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	累計已核定11件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	累計已核定11件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成19件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成20件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成20件計畫發包。
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成21件計畫發包。
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.2.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	9,430	6,723	6,723	71.29	71.29
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,315	1,249	1,249	94.98	94.98
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	3,617	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合

高雄市	3,085	2,931	2,931	95.01	95.01
屏東縣	23,479	24,766	24,766	105.48	105.48
宜蘭縣	1,538	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	42,084	23,038	23,038	54.74	54.74
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	84,548	58,707	58,707	69.44	69.44

3.3 工作項目三「補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫」

3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	20.00			20.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	100,000	75,951	75.95	35,343	0	0	111,294	111.29
預定工作摘要					執行說明			
計畫發包					已完成57件計畫發包。			
空間資料								
點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 預覽								



3.3.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	563.00	2,367.00
2	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	6,863.00	33,144.00
落後原因			環境品質工程年累計支用比未達 90%：因地方政府請款延誤。				
解決對策			環境品質工程年累計支用比未達 90%：已於114年7月29日推動會報稽催請款，預定於114年8月份趕上。				

3.3.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
----	-------	--------	--------	------

1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。
2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定10件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定10件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成16件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成19件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成	114/06/30符合	已完成57件計畫發包。
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成	114/07/31符合	已完成57件計畫發包。
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.3.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	656	216	216	32.93	32.93
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,073	818	818	76.23	76.23
苗栗縣	11,119	3,225	3,225	29.00	29.00
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合

嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	1,715	0	0	0.00	0.00
屏東縣	112,864	46,391	46,391	41.10	41.10
宜蘭縣	5,105	3,006	3,006	58.88	58.88
花蓮縣	62,143	15,536	15,536	25.00	25.00
台東縣	25,325	6,759	6,759	26.69	26.69
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	220,000	75,951	75,951	34.52	34.52

3.4 工作項目四「宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務」

3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	40.00			40.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	0	2,708	符合	2,708	0	0	5,416	符合
預定工作摘要					執行說明			
提交期中報告書					已於114年7月16日完成期中報告書審查。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.4.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.4.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
7	提交期中報告書	114/07/31完成	114/06/30超前	已於114年7月16日完成期中報告書審查。
12	提交期末報告書	114/12/31完成		

3.4.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(%; M/L)	補助款執行率(%; O/L)

台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	符合

3.5 工作項目五「辦理113年度保留案件」

3.5.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	50.00			86.15		36.15		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	30,000	58,107	193.69	2,406	4,031	0	64,544	215.15
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					保留案29件，已完成10件、執行中19件。			
空間資料								
點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料								

預覽



3.5.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標(預 定)	年度目標(實 際)	總目標值(預 定)
1	保留工程	113年保留 預算達成率 100%	%	0.00	100.00	86.15	100.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.5.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
12	保留工程進度達100%	114/12/31完 成		

3.5.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合

新北市	6,519	5,978	5,978	91.70	91.70
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,387	1,035	1,035	74.62	74.62
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	720	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	2,064	2,064	71.74	71.74
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	1,569	617	617	39.32	39.32
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	13,070	10,386	10,386	79.46	79.46
屏東縣	38,885	30,538	30,538	78.53	78.53
宜蘭縣	400	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	5,482	4,699	4,699	85.72	85.72
台東縣	4,014	2,790	2,790	69.51	69.51
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	74,923	58,107	58,107	77.56	77.56

4. 中央預算補助地方整體分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	7,175	6,194	6,194	86.33	86.33
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	12,401	9,308	9,308	75.06	75.06
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	18,181	4,947	4,947	27.21	27.21
苗栗縣	14,827	5,493	5,493	37.05	37.05
台中市	6,494	2,064	2,064	31.78	31.78
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	10,308	5,441	5,441	52.78	52.78
雲林縣	0	0	0	符合	符合

嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,812	2,376	2,376	84.50	84.50
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	18,486	13,581	13,581	73.47	73.47
屏東縣	178,567	101,695	101,695	56.95	56.95
宜蘭縣	8,147	3,816	3,816	46.84	46.84
花蓮縣	70,188	22,798	22,798	32.48	32.48
台東縣	74,015	32,587	32,587	44.03	44.03
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	421,601	210,300	210,300	49.88	49.88
