

# 宜居部落建設計畫 ( 111年—114年 )

## 114年5月執行進度

(本案作業計畫業於114年05月01日調整公告)

主辦機關：原住民族委員會(公共建設處) 114/06/04 10:01

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	宜居部落建設計畫 ( 111年—114年 )	個案計畫統一編號	<a href="#">A5-6211-1226</a>	
計畫期程	111/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	1,400,000	
計畫類別(先期類別)	公共建設(都市及區域發展)	總計畫經費(千元)(J)	1,420,192	
主管機關	原住民族委員會	年計畫經費(千元)(K)	516,999	
主辦機關(單位)	原住民族委員會(公共建設處)	院核管制編號	1110450	
共同主辦機關(中央)	原住民族委員會(公共建設處)	管制級別	部會管制	
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報	
執行地點	新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣	空間資料	<a href="#">預覽</a>	
計畫核定情形	宜居部落建設計畫 ( 111至114年 )：行政院 110年09月27日院臺原字第1100029028號			
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫、原住民族政策			
計畫年度目標	一、完成部落建設整體評估比例達5%。 二、完成部落風險或意見溝通達40場次。 三、提升部落防(減)災受益面積達240公頃。 四、保全受益部落人口數達4,800人。 五、改善文化景觀環境受益面積達948公頃。 六、聚會或特殊慶典參與人次達13,275人。			
計畫年度摘要	一、部落永續建設藍圖規劃。 二、強化部落安全防(減)災機能。 三、提升部落環境居住品質。			

註：本計畫與去年度1110450-宜居部落建設計畫 ( 111年—114年 ) 為關聯計畫

#### 1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技正	陳昱宏	02-8995-3271		as810197@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-8995-3228		wchuang0328@cip.gov.tw	計畫主辦人員
技士	吳易鍾	02-8995-3276		q860102@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫
技正	陳昱宏	02-89953271	02-89953684	as810197@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫
科長	黃文池	02-89953228		wchuang0328@cip.gov.tw	宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務
科長	黃文池	02-89953225		wchuang0328@cip.gov.tw	辦理113年度保留案件

## 2. 整體計畫執行情形

### 2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 85.74%，年分配經費執行率 127.82%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 98.24%，總分配經費執行率 103.43%。

年度：114 月份：5

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)			進度比較(B-A)百分點	
年累計	8.20			8.20			符合	
總累計	77.05			77.05			符合	
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	127,000	108,891	85.74	51,056	2,389	0	162,336	127.82
總累計	1,030,193	1,012,084	98.24	51,056	2,389	0	1,065,529	103.43
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				31.40			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				75.03			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				76.11			
支用比>100%或分配經費執行率≥120%原因說明								
1 工程施工：								

因部分案件核定金額較高，且本月份均達各期可請款條件，爰所請領金額業較高。

預定工作摘要	整體執行情形說明
<p>1110450-001：補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫 辦理藍圖規劃發包</p> <p>1110450-002：補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫 計畫公開招標</p> <p>1110450-003：補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫 計畫公開招標</p> <p>1110450-004：宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務 計畫管理</p> <p>1110450-005：辦理113年度保留案件 工程施工</p>	<p>藍圖規劃：已完成核定9件藍圖規劃</p> <p>防(減)災工程：已完成核定21件防減災工程</p> <p>環境品質工程：已完成核定22件環境品質工程</p> <p>行政事務：114年委辦案，執行中。</p> <p>113年度保留案件：保留案28件，22件執行中，6件已結案</p>

## 2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	8.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	56.00	280.00
3	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	547.00	820.00
4	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,542.00	16,400.00
5	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	0.00	2,367.00
6	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	0.00	33,144.00
7	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00

8	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	38.03	100.00
截至前一年度止總累計實際進度				截至前一年度止總累計已執行數(千元)			
75.00%				903,193			
重要執行成果							
<p>藍圖規劃：預定完成盤查及藍圖規劃部落比例 5%，截至114年5月底止，完成盤查及藍圖規劃部落比例 8%。</p> <p>藍圖規劃：預定完成與部落族人進行溝通40場次，截至114年5月底止，完成與部落族人進行溝通 56 場次。</p> <p>防(減)災工程：預定提升部落防(減)災受益面積 240 公頃，截至114年5月底止，防(減)災工程改善受益面積547 公頃。</p> <p>防(減)災工程：預定保全受益部落人口數 4,800 人，截至114年5月底止，防(減)災工程受益部落人口數 4,542 人。</p> <p>環境品質工程：預定因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積948公頃，截至114年5月底止，環境工程改善受益面積 0 公頃。</p> <p>環境品質工程：預定聚會或特殊慶典參與人次13,275 人次，截至114年5月底止，聚會或特殊慶典參與人數 0 人次。</p> <p>行政事務：預定辦理業務講習會、教育訓練 1 場次，截至114年5月底止，完成業務講習會、教育訓練 0 場次。</p> <p>113年度保留案件：預定113年保留預算達成率100%，截至114年5月底止，保留預算達成率38.03%。</p>							

### 2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	預算編列(預算遭凍結，致無法執行)
次要落後原因	行政作業(相關子計畫審查延誤或未完成)
落後原因分析	<p>防(減)災工程：年累計支用比未達 90%：配合行政院政策凍結50%，核定數僅80,932千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。</p> <p>環境品質工程：年累計支用比未達 90%：配合行政院政策凍結50%，另因地方政府執行、請款延誤，致執行率受影響。</p>
因應對策	<p>防(減)災工程：年累計支用比未達 90%：將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。</p> <p>環境品質工程：年累計支用比未達 90%：將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦及請款，預定於114年7月份趕上。</p>
檢討與建議	檢討與建議 計畫審查、核定延誤，將影響後續工程及預算執行進度，需落實計畫推動規劃，提前完成計畫審核。

上次管考建議	無填寫資料
上次管考建議辦理情形	無
主辦機關審查建議	無填寫資料
主管機關審查建議	無填寫資料

### 3. 年度工作執行情形

#### 3.1 工作項目一「補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫」

##### 3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：10.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	5.00			5.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	8,000	2,376	29.70	5,724	0	0	8,100	101.25
預定工作摘要					執行說明			
辦理藍圖規劃發包					已核定9件藍圖規劃			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 <a href="#">預覽</a>								



**3.1.2 工作項目目標**

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	8.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	56.00	280.00
落後原因			配合行政院政策凍結50%，核定數僅23,937千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。				
解決對策			將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。				

**3.1.3 查核點達成情形**

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定2件藍圖規劃	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定2件藍圖規劃。

2	累計核定3件藍圖規劃	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定3件藍圖規劃。
3	累計核定4件藍圖規劃	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定3件藍圖規劃。
4	累計核定6件藍圖規劃	114/04/30完成	114/04/30符合	已核定9件藍圖規劃。
5	完成3件藍圖規劃公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	完成3件藍圖規劃公告招標
6	累計完成4件藍圖規劃公告招標	114/06/30完成		
7	累計完成6件藍圖規劃發包	114/07/31完成		
8	提交2件藍圖規劃期中報告	114/08/31完成		
9	累計提交3件藍圖規劃期中報告	114/09/30完成		
10	累計提交4件藍圖規劃期中報告	114/10/31完成		
11	提交2件藍圖規劃期末報告	114/11/30完成		
12	累計提交3件藍圖規劃期末報告	114/12/31完成		

### 3.1.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,584	0	0	0.00	0.00
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	5,600	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	2,268	0	0	0.00	0.00
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	3,115	0	0	0.00	0.00
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,813	2,376	2,376	84.46	84.46
台南市	0	0	0	符合	符合


高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	2,592	0	0	0.00	0.00
宜蘭縣	810	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	2,563	0	0	0.00	0.00
台東縣	2,592	0	0	0.00	0.00
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	23,937	2,376	2,376	9.93	9.93

### 3.2 工作項目二「補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫」

#### 3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	7.00			7.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	50,000	42,343	84.69	7,846	0	0	50,189	100.38
預定工作摘要					執行說明			
計畫公開招標					已完成20件計畫公告招標。			
空間資料								
點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 <a href="#">預覽</a>								

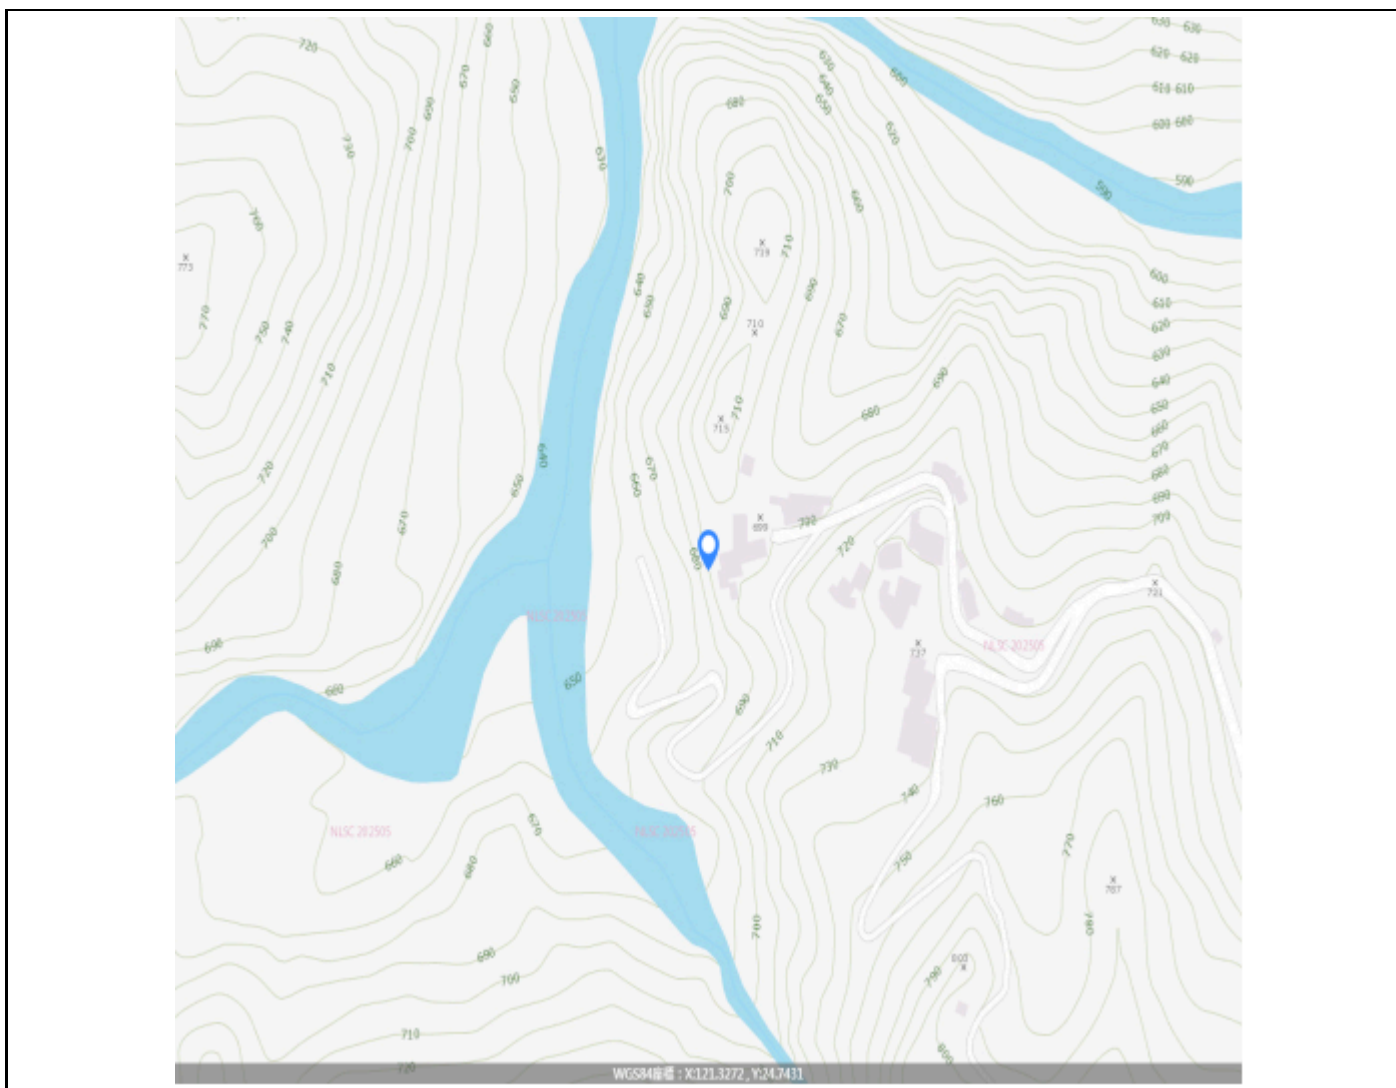

### 3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	547.00	820.00
2	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,542.00	16,400.00
落後原因				配合行政院政策凍結50%，核定數僅80,932千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。			
解決對策				將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。			

### 3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。

2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	累計已核定11件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	累計已核定11件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成19件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成20件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成		
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成		
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

### 3.2.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	9,430	1,954	1,954	20.72	20.72
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,315	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合

高雄市	3,085	2,931	2,931	95.01	95.01
屏東縣	23,479	13,179	13,179	56.13	56.13
宜蘭縣	1,538	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	42,084	24,280	24,280	57.69	57.69
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	80,931	42,344	42,344	52.32	52.32

### 3.3 工作項目三「補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫」

#### 3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	6.00			6.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	63,000	35,361	56.13	28,882	0	0	64,243	101.97
預定工作摘要					執行說明			
計畫公開招標					已完成19件計畫公告招標			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 <a href="#">預覽</a>								



### 3.3.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	0.00	2,367.00
2	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	0.00	33,144.00
落後原因			配合行政院政策凍結50%，另因地方政府執行、請款延誤，致執行率受影響。				
解決對策			將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦及請款，預定於114年7月份趕上。				

### 3.3.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
----	-------	--------	--------	------

1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。
2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定10件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定10件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成16件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成	114/05/31符合	累計已完成19件計畫公告招標
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成		
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成		
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

### 3.3.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	755	216	216	28.61	28.61
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	860	818	818	95.12	95.12
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合

嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	68,972	26,948	26,948	39.07	39.07
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	29,259	12,646	12,646	43.22	43.22
台東縣	7,739	2,224	2,224	28.74	28.74
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	107,585	42,852	42,852	39.83	39.83

### 3.4 工作項目四「宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務」

#### 3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	20.00			20.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	0	2,708	符合	0	0	0	2,708	符合
預定工作摘要					執行說明			
計畫管理					114年委辦案執行中。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 <a href="#">預覽</a>								



### 3.4.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
落後原因			無				
解決對策			無				

### 3.4.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
7	提交期中報告書	114/07/31完成		
12	提交期末報告書	114/12/31完成		

### 3.4.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(%; M/L)	補助款執行率(%; O/L)

台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	符合

**3.5 工作項目五「辦理113年度保留案件」**

**3.5.1 工作進度與計畫經費**

**進度計算基準：工作量 權重：5.00%**

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	30.00			30.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	6,000	26,103	435.05	8,604	2,389	0	37,096	618.27
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					保留案28件，22件執行中，6件已結案。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料								
點資料：1筆								
線資料：本計畫無「線」空間資料								

預覽



3.5.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	38.03	100.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.5.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
12	保留工程進度達100%	114/12/31完成		

3.5.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(%; M/L)	補助款執行率(%; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合

新北市	6,519	5,989	5,989	91.87	91.87
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,387	704	704	50.76	50.76
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	720	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	1,569	1,569	1,569	100.00	100.00
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	13,070	4,224	4,224	32.32	32.32
屏東縣	38,885	7,576	7,576	19.48	19.48
宜蘭縣	400	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	5,482	4,699	4,699	85.72	85.72
台東縣	4,014	3,731	3,731	92.95	92.95
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	74,923	28,492	28,492	38.03	38.03

#### 4. 中央預算補助地方整體分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	7,274	6,205	6,205	85.30	85.30
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	12,401	2,658	2,658	21.43	21.43
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	7,775	818	818	10.52	10.52
苗栗縣	2,988	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	4,684	1,569	1,569	33.50	33.50
雲林縣	0	0	0	符合	符合

嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,813	2,376	2,376	84.46	84.46
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	16,155	7,155	7,155	44.29	44.29
屏東縣	133,928	47,703	47,703	35.62	35.62
宜蘭縣	2,748	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	37,304	17,345	17,345	46.50	46.50
台東縣	56,429	30,235	30,235	53.58	53.58
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	287,376	116,064	116,064	40.39	40.39
