

宜居部落建設計畫 (111年—114年)

114年4月執行進度

主辦機關：原住民族委員會(公共建設處) 114/05/06 17:40

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	宜居部落建設計畫 (111年—114年)	個案計畫統一編號	A5-6211-1226
計畫期程	111/01/01~114/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	1,400,000
計畫類別(先期類別)	公共建設(都市及區域發展)	總計畫經費(千元)(J)	1,423,865
主管機關	原住民族委員會	年計畫經費(千元)(K)	526,701
主辦機關(單位)	原住民族委員會(公共建設處)	院核管制編號	1110450
共同主辦機關(中央)	原住民族委員會(公共建設處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣	空間資料	預覽
計畫核定情形	宜居部落建設計畫 (111至114年)：行政院 110年09月27日院臺原字第1100029028號		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫、原住民族政策		
計畫年度目標	一、完成部落建設整體評估比例達5%。 二、完成部落風險或意見溝通達40場次。 三、提升部落防(減)災受益面積達240公頃。 四、保全受益部落人口數達4,800人。 五、改善文化景觀環境受益面積達948公頃。 六、聚會或特殊慶典參與人次達13,275人。		
計畫年度摘要	一、部落永續建設藍圖規劃。 二、強化部落安全防(減)災機能。 三、提升部落環境居住品質。		

註：本計畫與去年度1110450-宜居部落建設計畫 (111年—114年) 為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
----	----	------	----	------	--------

科長	黃文池	02-8995-3228		wchuang0328@cip.gov.tw	計畫主辦人員
技正	陳昱宏	02-8995-3271		as810197@cip.gov.tw	計畫主辦人員
技士	吳易鍾	02-8995-3276		q860102@cip.gov.tw	計畫主辦人員
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫
科長	黃文池	02-89953228	02-89953684	wchuang0328@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫
技正	陳昱宏	02-89953271	02-89953684	as810197@cip.gov.tw	補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫
科長	黃文池	02-89953228		wchuang0328@cip.gov.tw	宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務
科長	黃文池	02-89953225		wchuang0328@cip.gov.tw	辦理113年度保留案件

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度超前 0.05 個百分點，年累計支用比 49.49%，年分配經費執行率 124.31%。

2.1.2 總累計執行進度超前 0.01 個百分點，總累計支用比 95.86%，總分配經費執行率 101.99%。

年度：114 月份：4

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	5.90			5.95		0.05		
總累計	76.48			76.49		0.01		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	80,000	39,593	49.49	59,854	0	0	99,447	124.31
總累計	977,164	936,757	95.86	59,854	0	0	996,611	101.99
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				18.88			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				69.99			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				71.19			
支用比>100%或分配經費執行率≥120%原因說明								

1 工程施工： 本月份因部分案件已達可請款要件，且因核定金額高，爰當期可請領金額佔比業較高。	
預定工作摘要	整體執行情形說明
1110450-001： 補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫 核定地方申請計畫 1110450-002： 補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫 計畫公開招標 1110450-003： 補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫 計畫公開招標 1110450-004： 宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務 計畫管理 1110450-005： 辦理113年度保留案件 工程施工	藍圖規劃：已完成核定9件藍圖規劃 防(減)災工程：已完成核定20件防減災工程 環境品質工程：已完成核定22件環境品質工程 行政事務：114年委辦案，執行中。 113年度保留案件：保留案28件，25件執行中，3件已完工

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	8.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	56.00	280.00
3	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	547.00	820.00
4	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,542.00	16,400.00
5	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	0.00	2,367.00
6	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	0.00	33,144.00

7	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
8	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	20.63	100.00
截至前一年度止總累計實際進度				截至前一年度止總累計已執行數(千元)			
75.00%				897,164			
重要執行成果							
<p>藍圖規劃：預定完成盤查及藍圖規劃部落比例 5%，截至114年4月底止，完成盤查及藍圖規劃部落比例 8%。</p> <p>藍圖規劃：預定完成與部落族人進行溝通40場次，截至114年4月底止，完成與部落族人進行溝通 56 場次。</p> <p>防(減)災工程：預定提升部落防(減)災受益面積 240 公頃，截至114年4月底止，防(減)災工程改善受益面積547 公頃。</p> <p>防(減)災工程：預定保全受益部落人口數 4,800 人，截至114年4月底止，防(減)災工程受益部落人口數 4,542 人。</p> <p>環境品質工程：預定因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積948公頃，截至114年4月底止，環境工程改善受益面積 0 公頃。</p> <p>環境品質工程：預定聚會或特殊慶典參與人次13,275 人次，截至114年4月底止，聚會或特殊慶典參與人數 0 人次。</p> <p>行政事務：預定辦理業務講習會、教育訓練 1 場次，截至114年4月底止，完成業務講習會、教育訓練 0 場次。</p> <p>113年度保留案件：預定113年保留預算達成率100%，截至114年4月底止，保留預算達成率20.63%。</p>							

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	預算編列(預算遭凍結，致無法執行)
次要落後原因	行政作業(相關子計畫審查延誤或未完成)
落後原因分析	<p>防(減)災工程：年累計支用比未達 90%：配合行政院政策凍結50%，核定數僅74,932千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。</p> <p>環境品質工程：年累計支用比未達 90%：配合行政院政策凍結50%，另因地方政府執行、請款延誤，致執行率受影響。</p>
因應對策	<p>防(減)災工程：年累計支用比未達 90%：將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。</p> <p>環境品質工程：年累計支用比未達 90%：將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦及請款，預定於114年7月份趕上。</p>

檢討與建議	計畫審查、核定延誤，將影響後續工程及預算執行進度，需落實計畫推動規劃，提前完成計畫審核。
上次管考建議	無填寫資料
上次管考建議辦理情形	無
主辦機關審查建議	無填寫資料
主管機關審查建議	無填寫資料

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「補助各縣市政府辦理「部落永續建設藍圖規劃」計畫」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：10.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	4.00			4.50		0.50		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	4,000	0	0.00	4,700	0	0	4,700	117.50
預定工作摘要					執行說明			
核定地方申請計畫					已核定9件藍圖規劃			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	部落盤查及藍圖規劃	完成盤查及藍圖規劃部落比例	百分比	48.00	5.00	8.00	37.00
2	辦理部落溝通座談會	完成與部落族人進行溝通之場次	場次	332.00	40.00	56.00	280.00
落後原因			配合行政院政策凍結50%，核定數僅23,937千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。				
解決對策			將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。				

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定2件藍圖規劃	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定2件藍圖規劃。

2	累計核定3件藍圖規劃	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定3件藍圖規劃。
3	累計核定4件藍圖規劃	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定3件藍圖規劃。
4	累計核定6件藍圖規劃	114/04/30完成	114/04/30符合	已核定9件藍圖規劃。
5	完成3件藍圖規劃公告招標	114/05/31完成		
6	累計完成4件藍圖規劃公告招標	114/06/30完成		
7	累計完成6件藍圖規劃發包	114/07/31完成		
8	提交2件藍圖規劃期中報告	114/08/31完成		
9	累計提交3件藍圖規劃期中報告	114/09/30完成		
10	累計提交4件藍圖規劃期中報告	114/10/31完成		
11	提交2件藍圖規劃期末報告	114/11/30完成		
12	累計提交3件藍圖規劃期末報告	114/12/31完成		

3.1.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,584	0	0	0.00	0.00
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	5,600	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	2,268	0	0	0.00	0.00
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	3,115	0	0	0.00	0.00
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,813	0	0	0.00	0.00
台南市	0	0	0	符合	符合


高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	2,592	0	0	0.00	0.00
宜蘭縣	810	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	2,563	0	0	0.00	0.00
台東縣	2,592	0	0	0.00	0.00
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	23,937	0	0	0.00	0.00

3.2 工作項目二「補助各縣市政府辦理「強化部落安全防(減)災機能」計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	5.00			5.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	24,000	21,432	89.30	3,689	0	0	25,121	104.67
預定工作摘要					執行說明			
計畫公開招標					已完成19件計畫公告招標。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料 預覽								

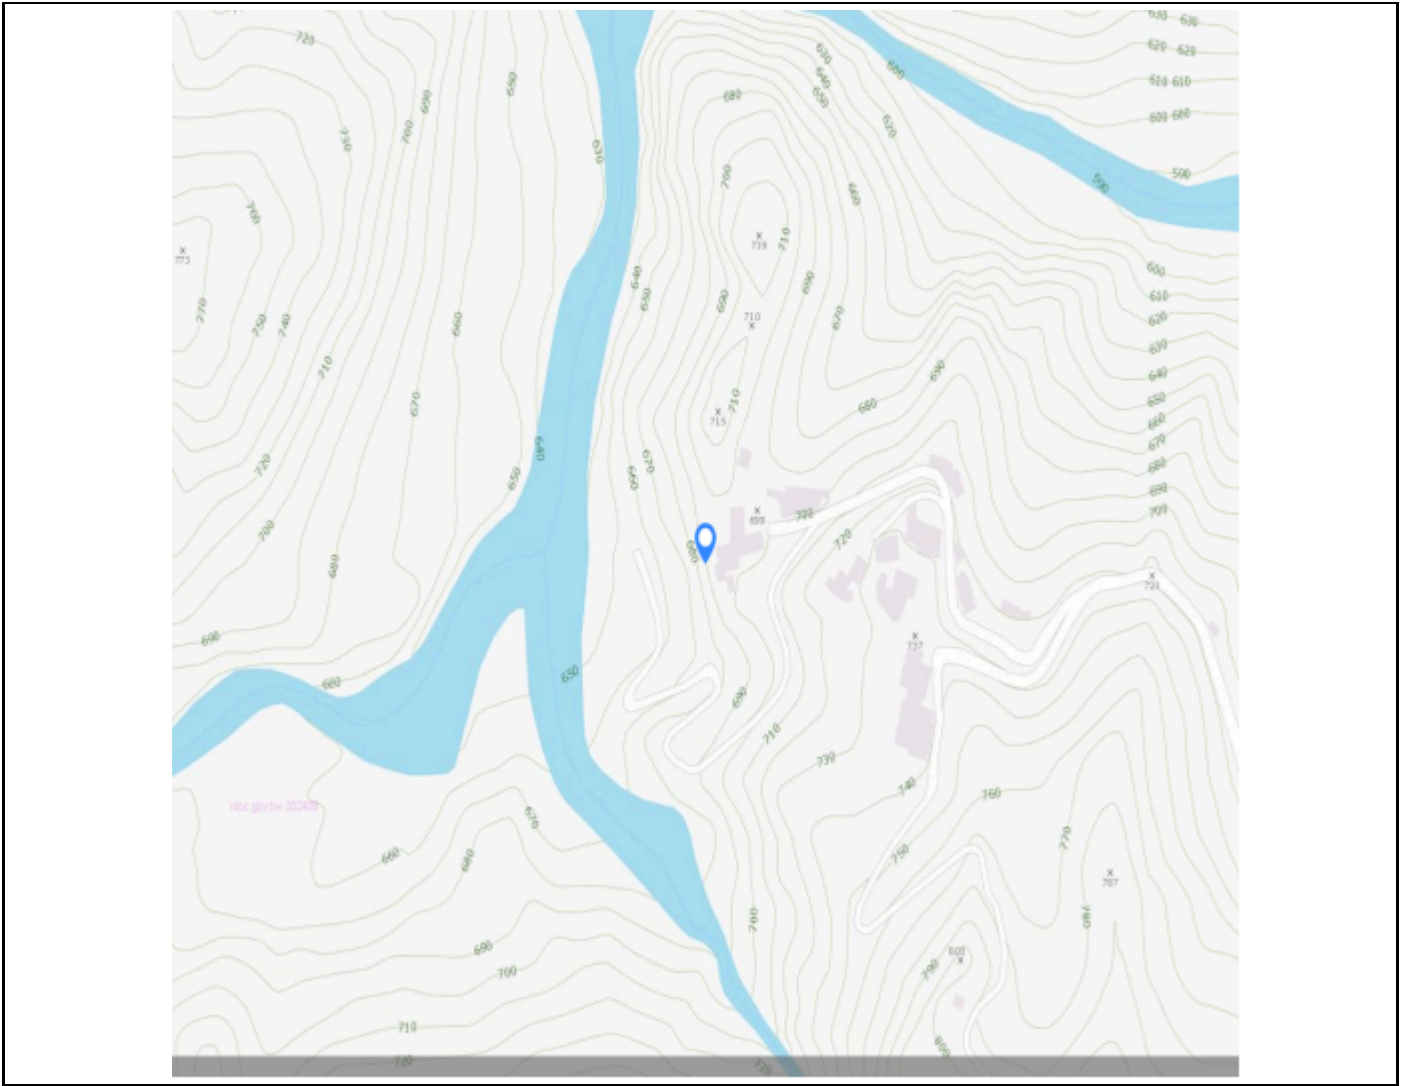

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	提升部落防(減)災能力	提升部落防(減)災受益面積	公頃	2,160.00	240.00	547.00	820.00
2	保全部落	保全受益部落人口數	人數	17,464.00	4,800.00	4,542.00	16,400.00
落後原因			配合行政院政策凍結50%，核定數僅74,932千元，且因地方政府修正計畫延誤，致計畫核定、執行數受影響。				
解決對策			將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦修正計畫，預計114年7月份趕上。				

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。

2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	累計已核定11件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	累計已核定11件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成19件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成		
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成		
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成		
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.2.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	9,430	1,954	1,954	20.72	20.72
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	1,315	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合

高雄市	3,085	0	0	0.00	0.00
屏東縣	17,479	3,526	3,526	20.17	20.17
宜蘭縣	1,538	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	42,084	24,280	24,280	57.69	57.69
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	74,931	29,760	29,760	39.72	39.72

3.3 工作項目三「補助各縣市政府辦理「提升部落居住環境品質」計畫」

3.3.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：40.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	5.00			5.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	46,000	0	0.00	51,465	0	0	51,465	111.88
預定工作摘要					執行說明			
計畫公開招標					已完成16件計畫公告招標			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：1筆 面資料：本計畫無「面」空間資料 預覽								



3.3.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	改善文化景觀環境	因辦理文化景觀環境工程改善而受益之部落面積	公頃	2,247.00	948.00	0.00	2,367.00
2	原鄉精神傳承與推廣程度	聚會或特殊慶典參與人次	人次	25,477.00	13,275.00	0.00	33,144.00
落後原因			配合行政院政策凍結50%，另因地方政府執行、請款延誤，致執行率受影響。				
解決對策			將先行辦理相關前置作業，並俟行政院宣佈解凍後，立即辦理經費核定等行政程序，另催請地方政府趕辦及請款，預定於114年7月份趕上。				

3.3.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
----	-------	--------	--------	------

1	核定1件計畫	114/01/31完成	114/01/31符合	已核定1件計畫。
2	累計核定1件計畫	114/02/28完成	114/02/28符合	已核定10件計畫。
3	累計核定4件計畫	114/03/31完成	114/03/31符合	已核定10件計畫。
4	完成1件計畫公告招標	114/04/30完成	114/04/30符合	已完成16件計畫公告招標。
5	累計完成4件計畫公告招標	114/05/31完成		
6	完成1件計畫發包	114/06/30完成		
7	累計完成4件計畫發包	114/07/31完成		
8	完成1件工程開工	114/08/31完成		
9	累計完成4件工程開工	114/09/30完成		
10	工程進度達50%以上1件	114/10/31完成		
11	工程進度達50%以上4件	114/11/30完成		
12	工程完工2件	114/12/31完成		

3.3.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	755	0	0	0.00	0.00
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	860	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合

嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	68,972	3,147	3,147	4.56	4.56
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	29,259	8,456	8,456	28.90	28.90
台東縣	7,739	0	0	0.00	0.00
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	107,585	11,603	11,603	10.78	10.78

3.4 工作項目四「宜居部落建設計畫宣導、審查、行政、品管等行政事務」

3.4.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	10.00			10.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(% (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(% (H/C)
年累計	0	2,708	符合	0	0	0	2,708	符合
預定工作摘要					執行說明			
計畫管理					114年委辦案執行中。			
空間資料								
面資料：本計畫無「面」空間資料 線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：1筆 預覽								



3.4.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練	場次	4.00	0.00	0.00	3.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.4.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
7	提交期中報告書	114/07/31完成		
12	提交期末報告書	114/12/31完成		

3.4.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)

台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	0	0	0	符合	符合
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	0	0	0	符合	符合
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	0	0	0	符合	符合
台中市	0	0	0	符合	符合
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	0	0	0	符合	符合
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	0	0	0	符合	符合
屏東縣	0	0	0	符合	符合
宜蘭縣	0	0	0	符合	符合
花蓮縣	0	0	0	符合	符合
台東縣	0	0	0	符合	符合
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	0	0	0	符合	符合

3.5 工作項目五「辦理113年度保留案件」

3.5.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：5.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	20.00			20.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率(%) (H/C)
年累計	6,000	15,453	257.55	0	0	0	15,453	257.55
預定工作摘要					執行說明			
工程施工					保留案28件，25件執行中，3件已完工。			
空間資料								
線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：本計畫無「面」空間資料 點資料：1筆								

預覽



3.5.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標(預定)	年度目標(實際)	總目標值(預定)
1	保留工程	113年保留預算達成率100%	%	0.00	100.00	20.63	100.00
落後原因			無				
解決對策			無				

3.5.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
12	保留工程進度達100%	114/12/31完成		

3.5.4 補助地方分布情形

縣市別	年度核定補助數(千元)(L)	年累計實際撥付數(千元)(M)	年累計實際執行數(千元)(O)	補助款撥付率(%; M/L)	補助款執行率(%; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合

新北市	6,519	0	0	0.00	0.00
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	1,387	0	0	0.00	0.00
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	0	0	0	符合	符合
苗栗縣	720	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	1,569	617	617	39.32	39.32
雲林縣	0	0	0	符合	符合
嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	0	0	0	符合	符合
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	13,070	4,224	4,224	32.32	32.32
屏東縣	38,885	3,123	3,123	8.03	8.03
宜蘭縣	400	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	5,482	4,699	4,699	85.72	85.72
台東縣	4,014	2,790	2,790	69.51	69.51
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	74,923	15,453	15,453	20.63	20.63

4. 中央預算補助地方整體分布情形

縣市別	年度核定補助數 (千元)(L)	年累計實際撥付 數(千元)(M)	年累計實際執行 數(千元)(O)	補助款撥付率(% ; M/L)	補助款執行率(% ; O/L)
台北市	0	0	0	符合	符合
新北市	7,274	0	0	0.00	0.00
基隆市	0	0	0	符合	符合
桃園市	12,401	1,954	1,954	15.76	15.76
新竹市	0	0	0	符合	符合
新竹縣	7,775	0	0	0.00	0.00
苗栗縣	2,988	0	0	0.00	0.00
台中市	2,877	0	0	0.00	0.00
彰化縣	0	0	0	符合	符合
南投縣	4,684	617	617	13.17	13.17
雲林縣	0	0	0	符合	符合

嘉義市	0	0	0	符合	符合
嘉義縣	2,813	0	0	0.00	0.00
台南市	0	0	0	符合	符合
高雄市	16,155	4,224	4,224	26.15	26.15
屏東縣	127,928	9,796	9,796	7.66	7.66
宜蘭縣	2,748	0	0	0.00	0.00
花蓮縣	37,304	13,155	13,155	35.26	35.26
台東縣	56,429	27,070	27,070	47.97	47.97
澎湖縣	0	0	0	符合	符合
金門縣	0	0	0	符合	符合
連江縣	0	0	0	符合	符合
總計	281,376	56,816	56,816	20.19	20.19
