



112年度
公益彩券回饋金補助計畫

計畫名稱：原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫

執行單位：屏東縣獅子鄉公所

簡報日期：中華民國112年10月25日



簡報大綱

- 壹 計畫摘要
- 貳 計畫預算執行狀況
- 參 計畫工作項目執行狀況
- 肆 計畫效益
- 伍 執行進度及經費支用落後之因應措施
- 陸 檢討與建議事項
- 柒 播放計畫亮點影片

計畫摘要

一 計畫目標

執行文化遺址調查，使後代子孫知悉，以達永續傳承。進行教育訓練，文化教育(族語學習、遺址及古道踏查方法、科技產品應用技術...等)及環境教育，為文化遺址及生態導覽建立基礎。

由資深之隊員帶領新進人員，學習工作技術，以行動維護傳統文化及生態資源，認識在地文化及生態，進而提昇愛護傳統文化及生態資源的心，降低不法盜取之事，使自然資源及文化遺產得以永續。

提供在地就業機會，使青年有機會可以回鄉服務，使老有所終，壯有所用，幼有所長。

秉持男女平權之精神(同工同酬)，公平分配工作。徵選時，成績優異之中低收入戶或生活困苦...等經濟弱勢人員，將優先提供其工作機會。

全隊遵守誠信、篤實、專業、健康的原則，嚴守紀律建立良好規範鼓勵青壯年洄游，教育青年之正確觀念。

壹

計畫摘要

二 計畫執行期間

自112年1月1日至112年12月31日止。

三 計畫實施地點

屏東縣獅子鄉境內。

四 計畫工作項目

8
人

聘用在地原住民族地區族人

26
小時

輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態管理維護導覽專才

12
0
處
公里

傳統文化遺址資料建檔整理維護

10
0
處
公頃

傳統生態資源維護及永續利用

20
件

友善部落增值服務

計畫摘要

五 計畫工作進度

工作項目	(執行期間：112年1月1日至112年12月31日)												
	第1季			第2季			第3季			第4季			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
聘用在地原住民族地區族人	√	√	√										
輔導與培訓傳統古道遺址 文化及自然生態環境管理 維護及導覽專才		√	√	√	√	√	√	√	√				
傳統文化遺址 資料建檔整理維護		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
傳統生態資源維護及永續利用		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
友善部落增值服務		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
預定工作累計執行進度	5%	10%	20%	25%	35%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	
預定預算累計執行進度	671,636元			1,679,091元			2,686,546元			3,358,182元			
預定預算累計執行率	20%			50%			80%			100%			

壹

計畫摘要

六 計畫預算

項目	內容	金額(元)	備註
人事費	薪資	2,423,245	計畫人員8名。
	勞保、職災、就業保險費	210,496	
	健保費	118,921	
	勞退補助	146,520	
	工作獎金	192,000	
	加班費	5,000	
	小計	3,096,182	
業務費	油料費	132,000	1. 計畫人員每月油料補貼：隊長 1,500元、隊員1,000元、文書助理 500元。 2. 除油料補貼不得勻出入，業務費 得視實際情形勻支。
	差旅費	30,000	
	雜支	100,000	
	小計	262,000	
計畫補助總金額		3,358,182	

貳

計畫預算執行狀況

一 經費支用情形

截至9月底經費運用情形	
計畫補助金額(A)	3,358,182元
總支用數(B)	2,344,541元
總執行率(B/A)	69.8%

累計 支用 數 (元)	季	預定支用數 (B)	實際支用數 (C)	預算執行率 % (C/B)
	一	671,636	643,033	95.7%
	二	1,679,091	1,491,062	88.8%
	三	2,686,546	2,344,541	87.3%

二 計畫經費管理

項目	姓名	現場檢附憑證
經費憑證保管人	主計單位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
經費支用管理人(專款專用)	王立緯	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
按時薪資發放-進用人員	全體隊員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投保勞健保-進用人員	全體隊員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
核銷單據是否已提出店家營業登記證明	(免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



計畫工作項目執行狀況

計畫執行情形

累計 進度 (%)	季	預定進度 (A)	實際進度(B)	進度差異%(B/A)
	一	20	43	23%
	二	50	67	17%
	三	80	94.4	14.4%

工作項目執行進度彙總表

項次	工作項目	預定進度	實際執行情形
1	聘用在地原住民族地區族人	招募計畫執行人員：8人	聘用計畫人員： 8人
2	輔導與培訓部落傳統文化、自然資源管理及環境教育導覽專才	辦理年度及地方教育訓練：26小時	年度及地方教育訓練累計時數： 26小時
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護	執行舊部落、古步道等傳統文化遺址資料建檔及整理維護工作：1處/120公里	遺址資料建檔地點： 3處 遺址整理維護工作路線累計里程： 105.7公里
4	傳統生態資源永續利用	執行傳統生態資源永續利用工作：100公頃。	部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、外來入侵動、植物預防性清除及防治等工作、推動申請環境教育設施場所認證，面積合計： 87.03公頃、1件
5	友善部落增值服務	友善部落增值服務：20件	協助天然災害救災應變、部落事項及有益於部落傳統文化事項等工作，合計： 17件



計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(一) 聘用在地原住民族地區族人

公告甄選：1月11日~1月13日

考試日期：1月16日(由縣政府統一辦理術課測驗、筆試、面試。)

錄取人員(8名)：隊長 何00；隊員 洪00、候00、許00、韋00、曾00(3月離職)、巴00(4月離職)；文書助理 田00

上工日期：1月19日

補徵隊員：李00(4月到職)、林00(5月到職)





計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(二)輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽專才

項目	課程名稱	日期/地點	人次	時數	執行進度	執行率
年度 教育訓練	年度計畫工作說明【計畫內容、管考方式、報表填列及常見錯誤態樣說明】	4/20~21日/南投縣承 萬尊爵酒店	7人	10小時	10小時	100%
	碳權議題					
	外來入侵種植物移除防治 及造林撫育					
	古道遺址整理維護相關實務手作步道與無痕山林					
	山地緊急救護(環境急症)及野外常見傷害處置					
臺灣南島民族植物						
地方 教育訓練	基本救命術課程訓練	3/28~29日/瑪家鄉公 所、東源森林遊樂區	7人	16小時	16小時	100%
	消費者保護之永續消費					
	性別主流化教育					
	文化培訓課程					
	森林火災課程訓練					
	常用機具維護及管理					
	機具維護管理-意見交流					
環境教育課程訓練						

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(二) 輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽專才





計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(三)傳統文化遺址資料建檔整理維護

工作項目	遺址名稱	地點	總目標	執行進度	執行率
傳統古道及 部落遺址	djeraw (吉敖部落)	丹路段619地號	1處	3處	300%
	tjaljadraviya (草山舊社)	南世段61地號			
	1638年荷蘭尋金之路(前往阿朗壹古道Djalan a sema 'aljungic 之前段路線)	南世村上方農路線			
傳統古道及部落 遺址整理維護	djeraw (吉敖部落)	丹路段619地號	120公里	105.7公里	88%
	tjaukuvukuvulj kacedas (tjubu) (大龜文王國 阿茲達斯社)	內獅段59地號			
	tjaukuvukuvulj Pungeljuljan (大龜文王國 旁武彥社)	內獅段84地號			
	tjaukuvukuvulj vuravurat遺址 (大龜文王國)	內獅段54地號			
	Tjaukuvukuvulj Vuli'ilj (大龜文王國 霧乙里社)	內獅段24地號			
牡丹路古道	上丹路部落				

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(二)傳統文化遺址資料建檔



計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(二) 傳統文化遺址整理維護



計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用

工作項目	執行情形	地點	總目標	執行進度	執行率
部落及傳統 山川資源維護	步道維護	獅頭山步道、新路部落無菸步道	40公頃	38公頃	95%
	清除垃圾	獅頭山廣場、卡悠峯瀑布區、沙布鐵橋(楓港溪)、阿拉夫拉夫橋(七里溪)。			
	生態紀錄	獅子段568-1地號、vuravurat遺址、內文部落、路過此步道、無菸步道、內文濕地			



112年獅子鄉維護隊山川資源維護調查表



筒傘節 (學名: *Bungarus multicinctus*)，又名鐵環蛇或鐵環蛇等，屬蝮蛇科環蝮屬，其增加詞「*multicinctus*」意為「多帶的」，而傘節因帶性大而聞名，去除方圓並有斑的蛇頭品為中藥材。

筒傘節 俗名: *kingu*

毒性: 筒傘節為台灣六大毒蛇之一，毒發後小，但毒性強烈，也是台灣及中國大陸等地毒蛇中毒性最強的一種，但不是台灣最毒的蛇。台灣最毒的蛇是長蛇海蛇，筒傘節則是台灣最毒的陸地蛇。1毫克即可致人死地，平均體重4.6克男。

筒傘節具有 α - β -bungarotoxin 神經毒素 (可特異性地阻斷神經系統中的 ACh 乙酰膽鹼子傳遞，使神經-肌肉接頭的傳遞受阻，導致肌肉鬆弛)，患者喉嚨不會感到疼痛，反而想睡。輕微中毒時身軀局部產生痲痺現象，若是毒藥作用於神經肌肉交接位置，則會阻斷神經傳遞，致使偏癱無法正常收縮，導致呼吸麻痺，作用時間約40分鐘至2小時，或長達24小時。可以用特異性抗毒血清治療。

分佈地區: 筒傘節分佈地區包括中國大陸南部、香港、緬甸、台灣、越南、等地。

習性: 筒傘節在夜間活動，多棲居水邊，以魚、蛙、蛇、鼠為食物，近來更擴了人類耕種與棲息地被破壞的興趣。



拍攝照片地點: 屏東縣獅子鄉新龍橋無菸步道。

112年5月26日

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用

工作項目	執行情形	地點	撫育區樹種	總目標	執行進度	執行率
造林區補植撫育	撫育除草	楓林段102地號、136號	櫟木、樟樹	50公頃	38.72公頃	77%
		就愛發揚段744地號、745地號、746地號	印度紫檀			
		丹路段328地號、904地號	櫟木、桃花心木			
		南世段378地號、1066地號	無患子、桃花心木			
		內獅段608地號	無患子			
		外獅段27地號、393地號、402地號。	無患子、樟樹、桃花心木			
		獅子段375地號、565-2地號、568-1地號、596地	櫟木、樟樹、桃花心木、楓香			
	執行情形	地點	新(補)植樹種/數量			
	新(補)植 造林	楓林段102地號	櫟木/250棵、樟樹/300棵			
		楓林段136地號	樟樹/150棵			
		丹路段328地號	桃花心木/150棵			
		丹路段904地號	櫟木/200棵			
		外獅段393地號	樟樹/250棵、桃花心木/250棵			
		獅子段375地號	櫟木/200棵			
獅子段565-2地號		櫟木/520棵、樟樹/150棵、桃花心木/250棵、楓香/950棵				
執行情形	地點					
造林地整地	外獅段393地號					
	獅子段565-2地號、568-1地號					

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用





計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用

工作項目	執行情形		地點	總目標	執行進度	執行率
外來入侵物種預防性清除及防治	移除銀合歡	使用鏈鋸、鐮刀、割草機等工具砍除，做整理後放置原地。	丹路段328地號	10公頃	10.31公頃	103%
			外獅段27地號、42-13地號、514地號、514-1地號、520地號、532-1地號、595地號、596地號、597地號			
			獅子段358-2地號、359-2地號、360-1地號、525-1地號、525-2地號、527-2地號、529-3地號、535-2地號、582-8地號、602-1地號、604-2地號			
			南世段378地號、1066地號			
			新路段 R209地號(楓港溪)			
	執行情形		地點			
移除刺軸含羞木	使用鏈鋸、鐮刀、割草機等工具砍除，做整理後放置原地。	楓港溪(丹路段)				
		楓港溪(新路段)				

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用



計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(四) 傳統生態資源永續利用

工作項目	執行情形	地點	總目標	執行進度	執行率
推動申請環境教育設施場所認證	環境教育課程訓練	東源部落環境教育中心	1處	0處(1件)	100%





計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(五) 友善部落加值服務

工作項目	執行情形	地點	總目標	執行進度	執行率
協助部落事項	公共環境整理除草、清除垃圾	內獅公墓、丹路公墓、南世村、內獅村、獅子村、楓林村、竹坑村	18件	15件	83%
	協助搭設、撤收清明祭祀用架子、帳篷	丹路村、內獅村			
	協助農產活動場地整理	獅子村			
	協助搬運防災用沙包	伊屯部落			
	颱風前後巡視村落路況、溪流水況及清除樹枝、垃圾	全鄉8村			
工作項目	執行情形	地點	總目標	執行進度	執行率
協助有益於部落傳統文化事項	協助2023 射不力年祭：部落巡禮路線整理	Tjaqanivung 遮加尼門、牡丹路古道	2件	2件	100%

計畫工作項目執行狀況

三 工作項目執行及成果照片

(五) 友善部落增值服務



肆

計畫效益

一 累計受益人數

量化指標

- 補助就業人數
- 計畫轉職狀況

>>

實際執行情形

- 8人
- 隊員 曾00 1/19進用至3/17離職，遞補隊員 李00 4/7日到職
- 隊員 巴00 1/19進用至3/31日離職，遞補隊員 李00 5/1日到職


二 量化效益

項次	績效指標	量化效益	實際數量
1	聘用在地原住民族地區族人(人)	8人	8人
2	輔導與培訓部落傳統文化、自然資源管理及環境教育導覽專才(小時)	26小時	26小時
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護(處/公里)	1處/120公里	3處/105.7公里
4	傳統生態資源永續利用(公頃)(處/件)	100公頃	87.03公頃、1件
5	友善部落增值服務(件)	20件	17件

肆

計畫效益

三 質化效益

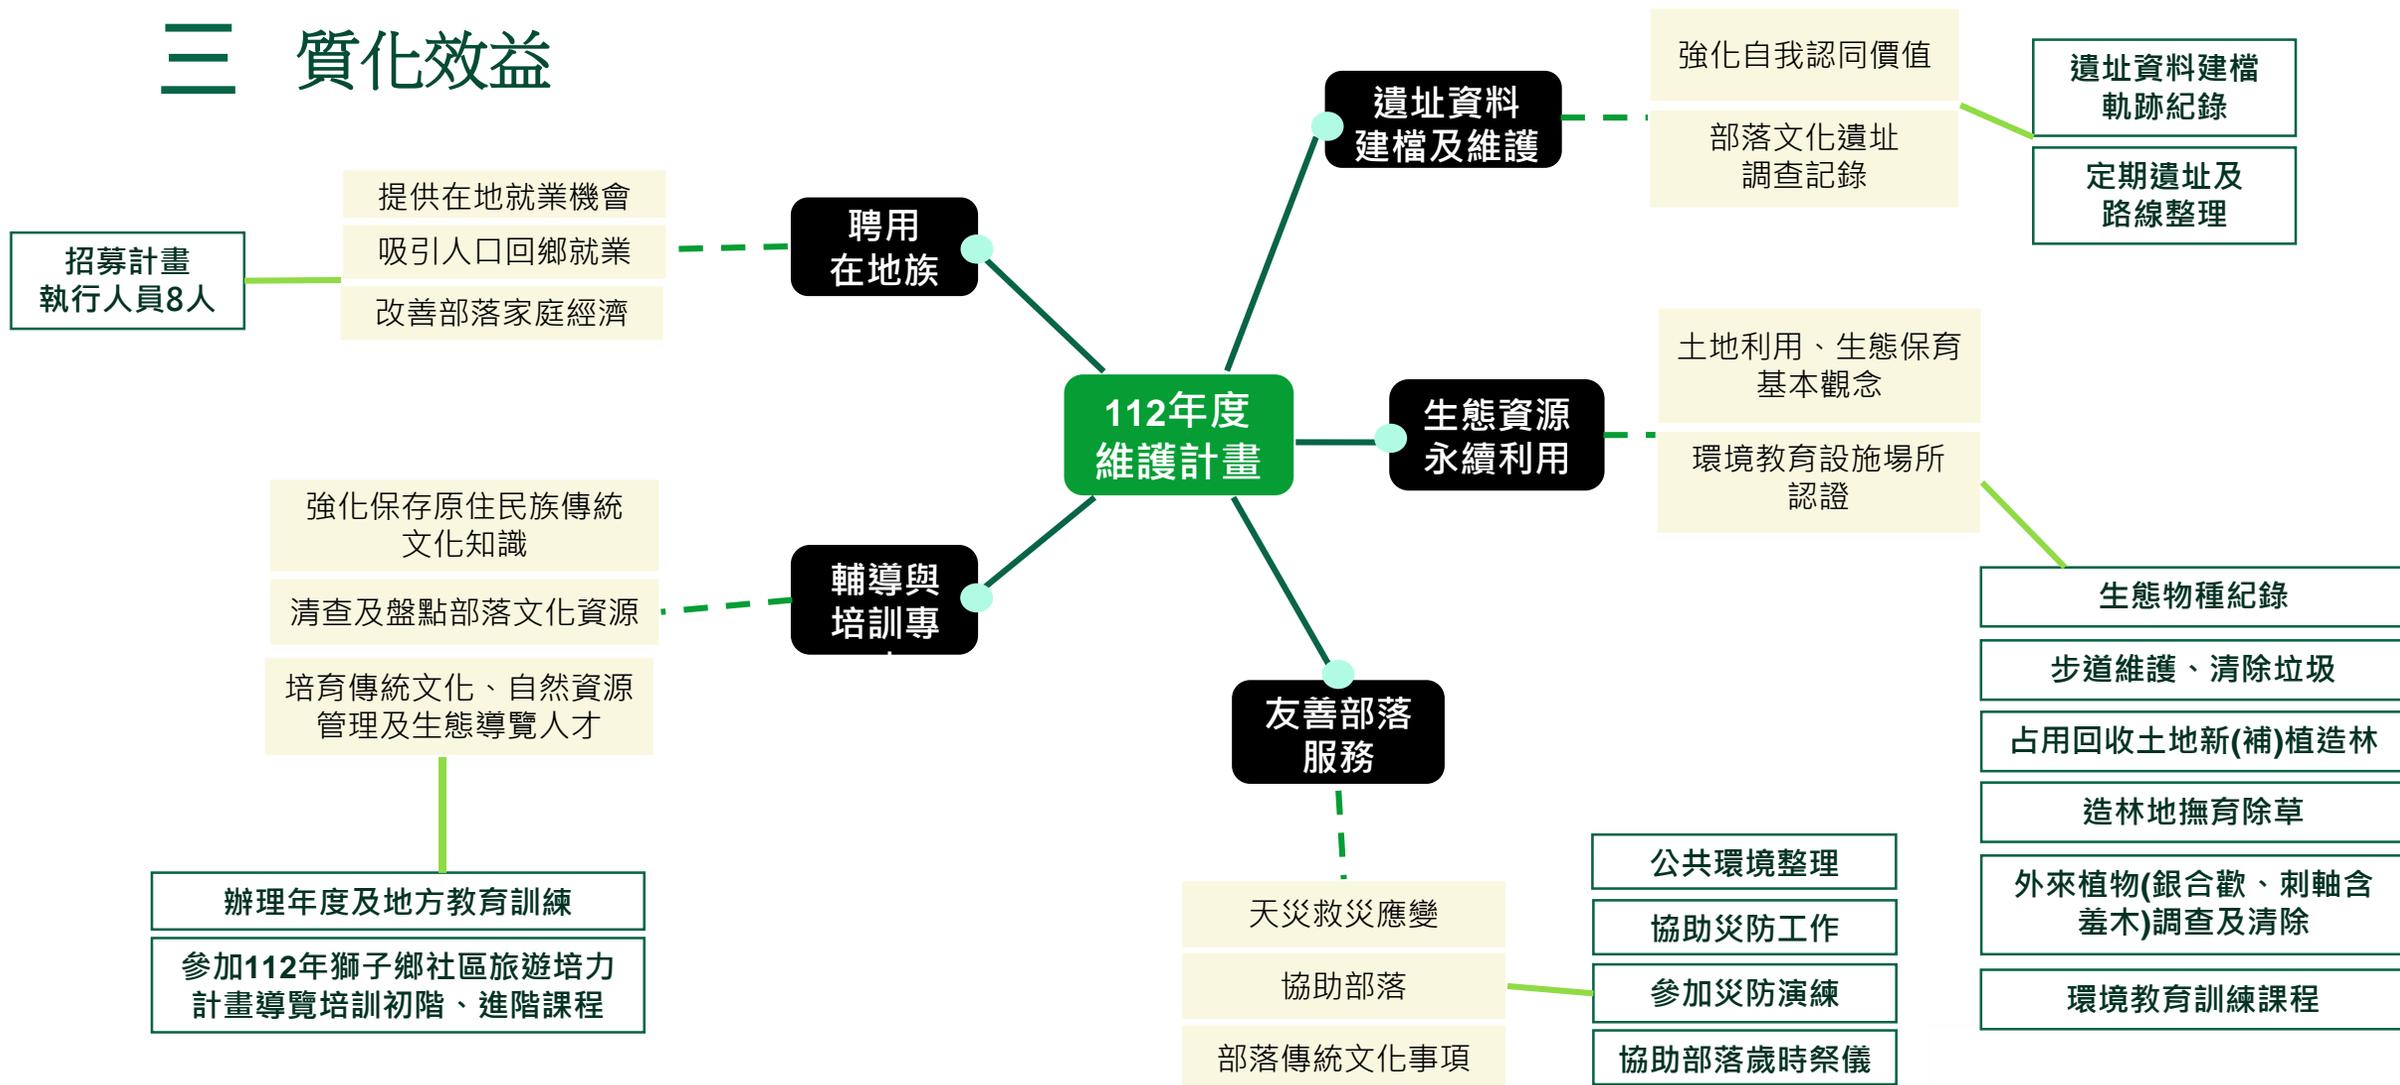

執行進度及經費支用落後之因應措施

一 工作進度落後原因及因應措施

落後項目	預定進度	實際進度	落後原因	因應對策
造林區補植撫育	80%	77%	因颱風影響連日大雨顧及隊員安全無法安排除草工作及9月排定參加112年獅子鄉社區旅遊培力計畫導覽培訓初階課程	預定10月排定工作期程達成工作進度

二 預算支用落後原因及因應措施

落後項目	預定進度	實際進度	落後原因	因應對策
經費執行	80%	69.8%	因計畫人員離職及工作獎金尚未發放	預定於計畫結束前達成預定目標

討論與建議事項

— 111、112年度計畫工作執行成果與委員建議事項之對照及檢討

112年社區旅遊培力計畫導覽培訓初階課程

日期	課程名稱	上課地點
9月1日	市場分析	獅子鄉文物館
	性別平等	獅子鄉圖書館
9月5日	獅子鄉歷史人文解說實務	獅子鄉圖書館
	職業安全衛生及傷害預防	
9月6日	恆春半島在地歷史	獅子鄉圖書館
9月8日	遊客心理與行為	獅子鄉文物館
	觀光景點資源盤點與經營	
9月11日	解說技巧及應用	獅子鄉文物館
	部落遊程規劃與設計	丹路村、新路部落
9月12日	急救課程與實際訓練	獅子鄉文物館
9月15日	解說技巧及應用	獅子鄉文物館
9月22日	戶外課程-東源濕地生態旅遊經驗分享	東源森林遊樂區
9月23日	戶外課程-社區導覽實地演練	內文部落
9月25日	認證考試	獅子鄉文物館



112年社區旅遊培力計畫

SISIGU 屏東縣獅子鄉

導覽培訓課程 — 初階

8月
03 09:00-12:00 導遊實務與解說技巧
04 09:00-12:00 獅子鄉歷史人文解說實務
9月
01 09:00-12:00 市場分析
05 09:00-12:00 獅子鄉歷史人文解說實務
06 09:00-12:00 職業安全衛生及傷害預防
08 09:00-12:00 恆春半島在地歷史
11 09:00-12:00 遊客心理與行為
15 09:00-12:00 觀光景點資源盤點與經營
18 09:00-12:00 戶外課程-東源濕地生態旅遊經驗分享
22 09:00-12:00 戶外課程-社區導覽實地演練
23 09:00-12:00 認證考試

導覽培訓課程 — 進階

10月
03 10:00-16:30 丹路村、新路部落
04 10:00-16:30 丹路村、新路部落
05 09:00-12:00 丹路村、新路部落
06 10:00-16:30 丹路村、新路部落

本計畫旨在提升鄉內觀光服務品質，協助優化在地實質之知能，將透過課程及認證機制，培育獅子鄉特約之專業導遊員。通過認證者將可獲得鄉公所核予證書，並於未來推廣社區旅遊服務時，成為優先安排對象。

報名資格 |
有意願與訓練成獅子鄉特約導遊員之民眾
(獅子鄉民優先，亦歡迎鄉外民眾報名)

培訓標準 |
完成至少39小時之課程
認證考試通過標準 |
課程加時數48小時，須完成39小時之課程，
才具報名資格，
筆試佔比40%、口試佔比40%、出席率佔比20%

聯絡人 |
獅子鄉公所 彭聯誠
彭聯誠 (08)877-1129#47

報名連結 |

QR Code



討論與建議事項

一 111、112年度計畫工作執行成果與委員建議事項之對照及檢討

112年社區旅遊培力計畫導覽培訓初階課程執行成果



日期：112年9月1日
項目：112年社區旅遊培力計畫
導覽培訓初階課程-性別平等
地點：獅子獅圖書館



日期：112年9月6日
項目：112年社區旅遊培力
計畫導覽培訓初階課程-鹿
寮平原在地歷史
地點：獅子獅圖書館



日期：112年9月12日
項目：112年社區旅遊培力
計畫導覽培訓初階課程-志
救課程與實際訓練
地點：獅子獅文物館



日期：112年9月25日
項目：112年社區旅遊培
力計畫導覽培訓初階課
程-認證考試
地點：獅子獅文物館



日期：112年9月8日
項目：112年社區旅遊培力
計畫導覽培訓初階課程-觀
光景點資源盤點與經營
地點：獅子獅文物館



日期：112年9月11日
項目：112年社區旅遊培力
計畫導覽培訓初階課程-鄉
鎮遊程規劃與設計
地點：獅子獅文物館



日期：112年9月23日
項目：112年社區旅遊培力
計畫導覽培訓初階課程-戶
外導遊：社區導覽實地訓練
地點：內文部落



日期：112年9月25日
項目：112年社區旅遊培
力計畫導覽培訓初階課
程-認證考試
地點：獅子獅文物館


討論與建議事項

二 建議事項

1	建議計畫人員團體保險由縣市政府統一辦理。
2	安排課程及編列預算經費提供計畫人員上課、考取業務相關證照。
3	增列人員考核機制，考核成績可納入下年度計畫人員徵選之進用加分項目。

柒

播放計畫亮點影片

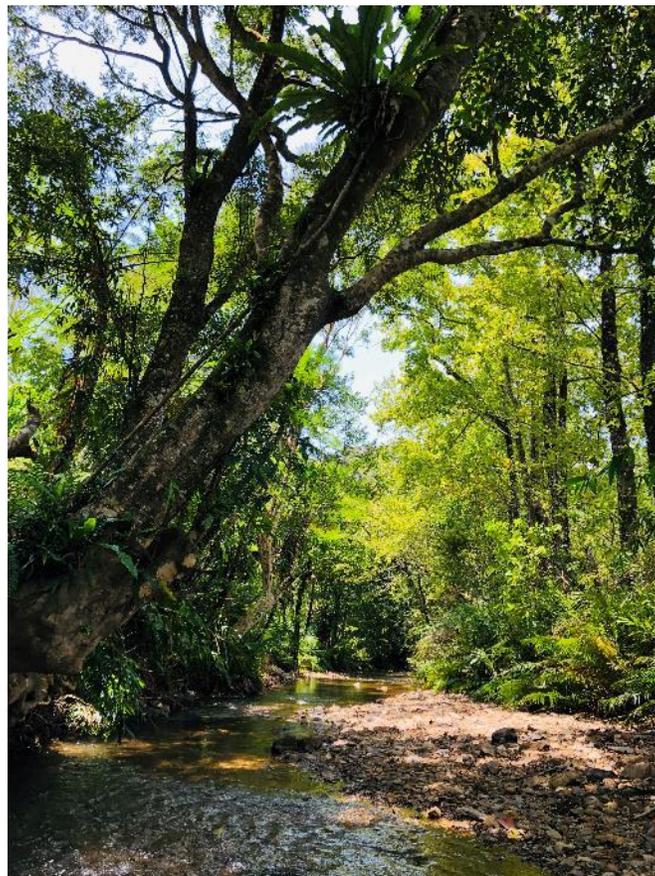

簡報結束 敬請指教
